


旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-005

日期及气候：2018.11.1 晴	工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序：车队区箱逆变基础接地	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	

施工人员到达现场，机械、工具、材料已准备。由施工领班进行技术交底，然后开始工作。施工人员按照接地规范用 50*5 接地扁钢对箱逆变基础进行环网接地。

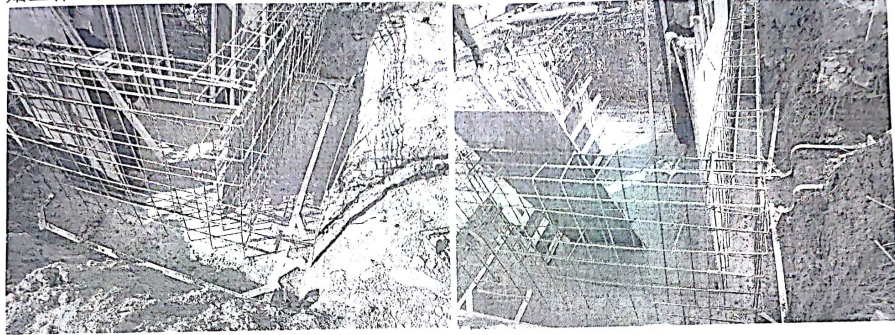

监理情况：

现场监理人员要求施工人员按照尺寸做好环网，并进行测量，要求施工方在焊接位置进行三面焊接以保证接地扁铁接触长度及接触面积。

发现的问题及处理情况：

焊接接地时出现焊渣容易导致接地生锈，要求施工方对接地进行焊渣处理及防腐。

旁站监理人员（签字）：张廷志

2018年11月1日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
