

旁站监理记录表


工程名称: 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期及气候:	2018.11.1 晴	工程地点:	湖南省永州市零陵区珠晖滩
旁站监理的部位或工序:			车队区箱逆变基础浇筑
旁站监理开始时间:	14:00	旁站监理结束时间:	17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 机械、工具、材料已准备。由施工领班进行技术交底, 然后开始工作。检查绑扎钢筋笼与模板牢固, 之后将混凝土浇筑, 并用振动棒振捣。

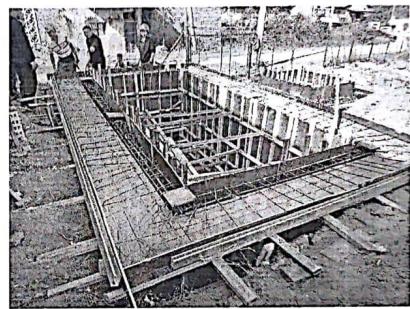

监理情况:

现场监理人员要求施工人员按照尺寸做好基础, 并进行测量, 对绑扎的钢筋进行测量, 另外在灌浆时要求施工单位对其用振动棒搅拌。

旁站监理人员(签字): 伍志勇、张良生

2018年11月1日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
