

旁站监理记录表

工程名称: 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-008

日期及气候: 2018.11.1 晴

工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩



旁站监理的部位或工序: 供销区区箱逆变基础浇筑

旁站监理开始时间: 14:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场，机械、工具、材料已准备。由施工领班进行技术交底，然后开始工作。检查绑扎钢筋笼与模板牢固，之后将混凝土浇筑，并用振动棒振捣。

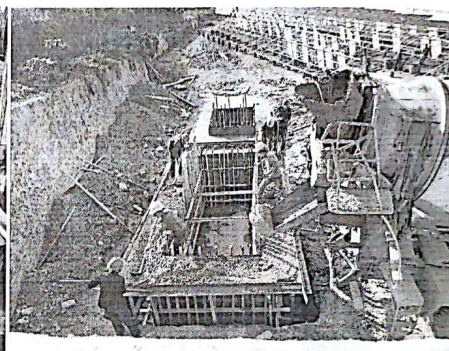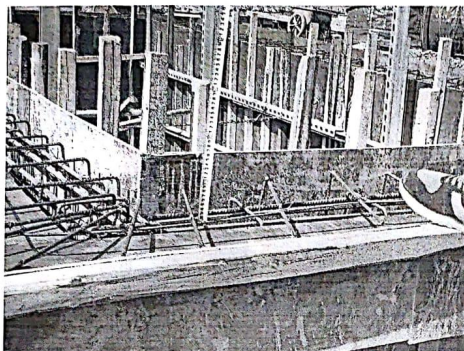

监理情况:

现场监理人员要求施工人员按照尺寸做好基础，并进行测量，对绑扎的钢筋进行测量，另外在灌浆时要求施工单位对其用振动棒搅拌。

旁站监理人员（签字）：任志云、张良奎

2018年 11月 1 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。
