

旁站 监 理 记 录 表


工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-011

日期及气候：2018.11.10	多云	工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序：车队区高压电缆与通讯电缆敷设并直埋		
旁站监理开始时间：14:00		旁站监理结束时间：17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工人员到达现场，挖掘机准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底，然后开始工作。

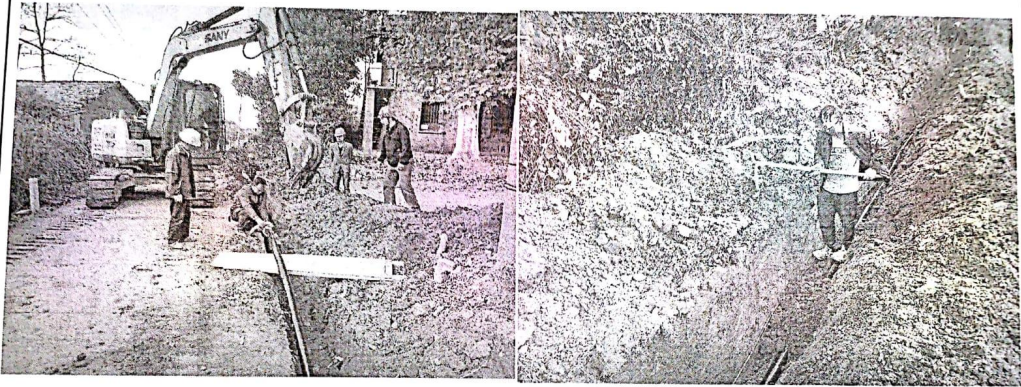

监理情况：

挖掘机根据现场开挖电缆沟，对现场电缆进行人工与机械配合的敷设，敷设电缆时要求清理掉回填土里面的石头砖块防止损坏电缆，另外通讯电缆敷设时与高压电缆保持40公分的距离防止直埋后的磁场干扰。

发现的问题及处理情况：

回填土掺杂石块较多，已要求施工方回填前对回填土中的石块进行清理。

旁站监理人员（签字）：张良玉 任志远

2018年11月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。
