

旁站监理记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-TSPZ-002

日期及气候: 2018. 10. 30 晴

工程地点: 江苏省宿迁市沭阳县经济开发区台北大道 13 号腾盛纺织厂区


旁站监理的部位或工序: 1#屋面夹具安装

旁站监理开始时间: 9:00

旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工安装人员到达现场, 工器具已准备。由施工领班进行安装交底, 然后开始工作。将夹具吊装上屋面, 测量好夹具安装之间的距离, 符合要求后, 将夹具用螺丝固定在屋面彩钢瓦棱边上。

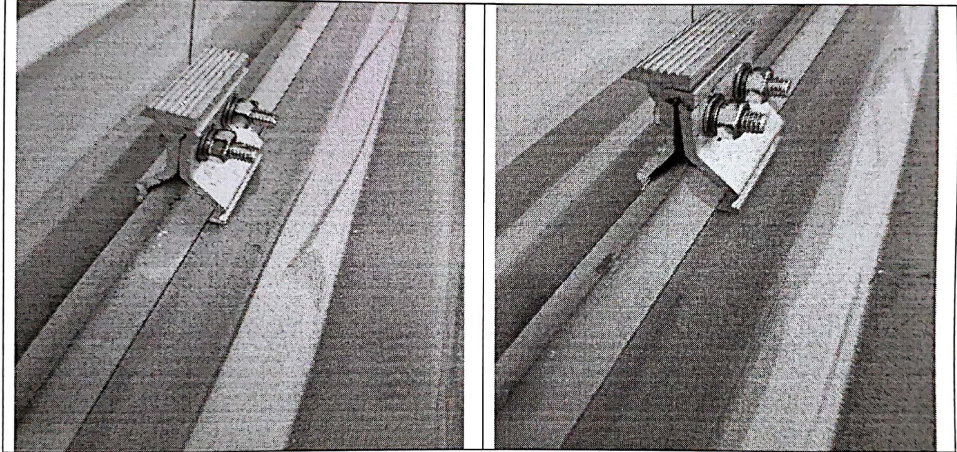

监理情况:

现场监理人员要求安装人员做好安全防护, 并且按照施工图纸测量好夹具之间的距离, 检查夹具是否紧固到位, 是否紧固位置偏离, 不合格的要求施工方进行整改。已安装好的夹具, 要求施工单位质检人员进行检查, 有松动的地方要及时调整紧固。

发现的问题及处理情况: 夹具紧固不到位以现场要求整改

旁站监理人员(签字): 张锐

2018年10月30日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。
