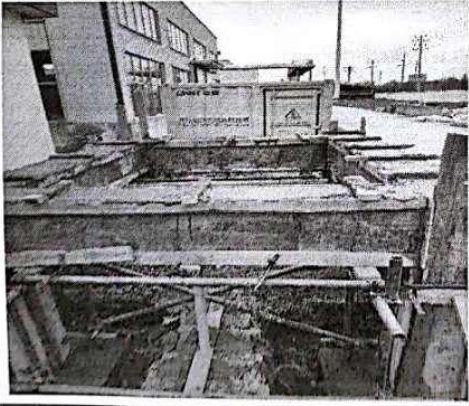


旁站监理记录表

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSPZ-004

日期：2018 年 12 月 07 日 天气：阴	施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 12 月 07 日 11 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 12 月 07 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电气设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 8 人、钢筋工 1 人、模板工 人、安装人员 人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、使用混凝土垫块是□否□符合要求，垫层底板上或模板内是□否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是□否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋是□否□存在贴模板现象，钢筋骨架是□否□被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇筑是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。 10、混凝土标号 C30，浇筑 7 m³。 11、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。	
 	
发现的问题及处理情况： 现场旁站，发现局部模板漏浆及振捣不到位，以现场要求施工人员整改。	
旁站监理人员（签字）：杨锐锐 2018 年 12 月 7 日	
