

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-08

日期及气候：2018 年 11 月 27 日 晴 9-21℃

施工地点：7、9#楼屋面基础


旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：16:00

施工情况：

- 施工单位施工人员 16 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 16 方。

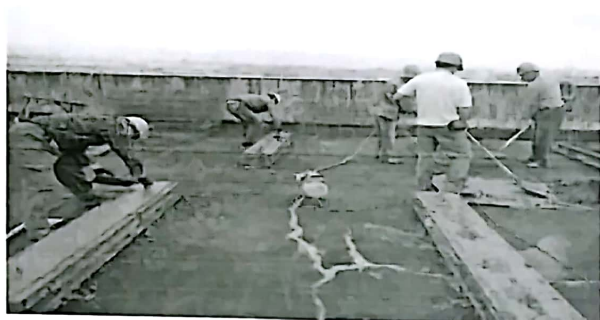

监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 基础砼浇筑个别振捣不严。
- 个别基础砼出现塌落。

处理意见：

- 1、安排人立即重新振捣。
- 2、安排人对基础表面重新找平整形。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：湖北湘电建设工程有限公司

质检员：

日期：2018 年 11 月 27 日

项目监理机构：正衡监理

旁站监理人员：

日期：2018 年 11 月 27 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
