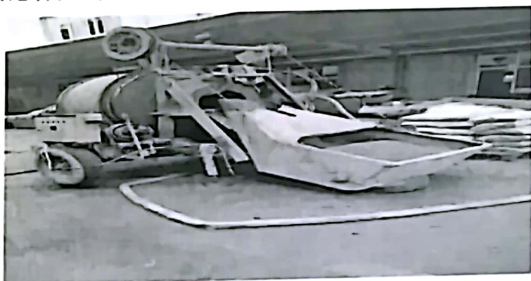


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-PZ-02

日期及气候：2018 年 11 月 19 日晴 11-16℃	施工地点：3#楼屋面基础
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：16：00
施工情况： • 施工单位施工人员 14 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 15 方。  	
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： • 有时小雨覆盖不及时。 • 基础砼表面未抹光。	
处理意见： 3、安排人立即对砼基础进行覆盖防雨。 4、安排人对基础表面立即重新找平抹光。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：<u>湖北湘电建设工程有限公司</u> 质检员：<u>李春</u> 日期：2018 年 11 月 20 日	项目监理机构：<u>正衡监理</u> 旁站监理人员：<u>黎建光</u> 日期：2018 年 11 月 20 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
