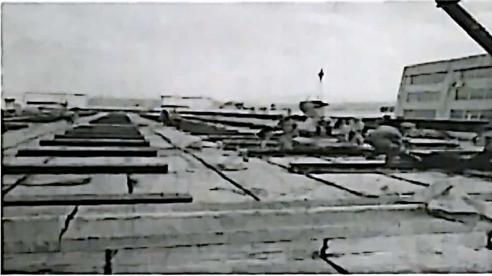



表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号:ZHJL-PZ-03

日期及气候: 2018年11月12日 晴 7-15°C	施工地点: 2#楼屋面基础
旁站监理的部位和工序: 光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 16: 00
<p>施工情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 施工单位施工人员 16 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 16 方。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>监理情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查模板、钢筋工程质量及施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。 	
<p>发现问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 基础预埋件个别位移。 • 基础砼表面未抹光粗糙不平。 	
<p>处理意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安排人立即对砼基础、预埋件进行调整至位置。 2、安排人对基础表面重新找平抹光。 	
<p>备注(包括处理结果):</p> <p>施工单位已整改完成。</p>	
承包单位: <u>湖北湘电建设工程有限公司</u> 质检员:  日期: 2018年11月22日	项目监理机构: <u>正衡监理</u> 旁站监理人员:  日期: 2018年11月22日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
