

## 旁站监理记录表


工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：JZL6-01

|                    |         |                    |
|--------------------|---------|--------------------|
| 日期及天气：2018、12、9    | 小雨 1~5℃ | 施工单位：泰州市振发建设工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：配电室盘柜安装 |         |                    |
| 旁站监理开始时间：13 点 10 分 |         | 旁站监理结束时间：17 点 20 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

现场施工人员 8 人，主要采用钢管对盘柜进行滚动位移。盘柜基础槽钢水平度基本符合设计要求，盘柜的型号符合设计要求，按照设计图纸的要求，依次进行安装排放。整个安装过程平稳有序，柜体的垂直度、水平度基本符合设计及规范要求，柜体已按照要求进行了有效接地。

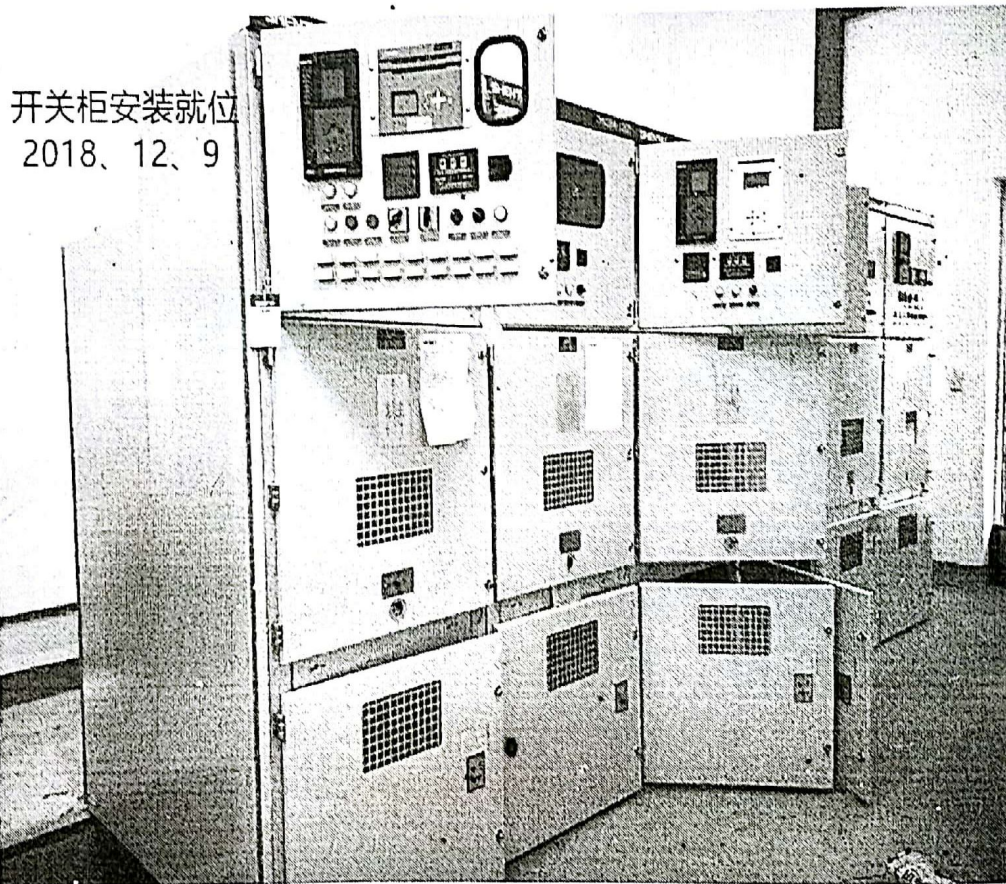

发现的问题及处理情况：

整个施工程序符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）：

