

旁站监理记录表

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号：ZHJL-YLFP-ZLPZ-001

日期及气候：2018年11月16日 晴

工程地点：榆林市横山区村级联建光伏扶贫项目场区


旁站监理的部位及工序：地桩基础砼浇筑

旁站监理开始时间：08:30

旁站监理结束时间：10:30

施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。

监理情况：监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸，均符合要求。检查地桩放点位置是否准确，检查钢筋材料合格证及检验证明。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后夜间进行保温措施，进行养护。

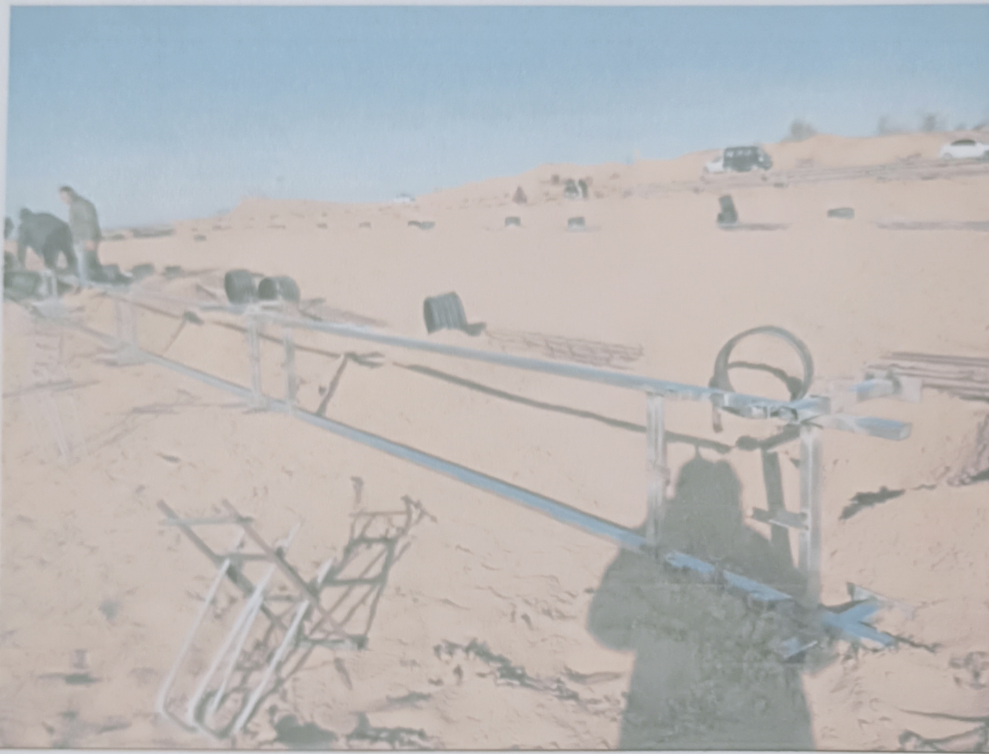

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：陕西拓日新能源科技有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目部

项目监理机构：榆林市横山区联村光伏扶贫电站项目监理部

质检员（签字）：鱼利英

旁站监理人员（签字）：张峰

2018年 11 月 16 日

2018年 11 月 16 日
