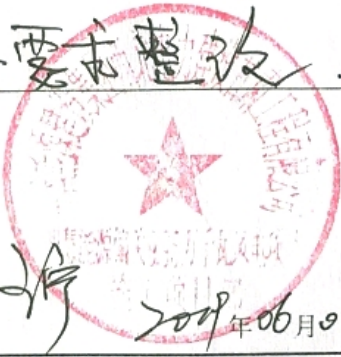


旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-05- F39-001

日期	2019.06.08	天气	多云	气温	19-27℃
施工部位	F39 风机机位	旁站部位及工序	基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	6:15	旁站结束时间	15:10		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。 3、工器具组织情况：泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、大体积混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、测温点已按方案要求布置完成。 4、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 5、混凝土浇筑间隔时间 30 分钟，混凝土浇筑方量 467 m³ 6、现场坍落度值抽测情况：178 mm，179 mm，179 mm。 7、混凝土试块留置：一共 8 组，同条件养护 3 组，标养 5 组。 8、基础环环平复测：过程差值：0.2 mm/测量时间 9:50 浇筑后差值：0.3 mm/测量时间 15:30					
发现问题： 底层模板出现漏浆，模板缝隙过大，螺栓未拧紧。					
处理意见： 检查纠正漏浆情况，堵严模板缝隙，随时处理好漏浆。					
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）：  2019 年 06 月 08 日		旁站人员（签字）：  2019 年 06 月 08 日			
