

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源调度中心500万千瓦风电项目

编号: PGPD-PZ-2019-007

日期	2019.5.25	天气	晴	气温	13-26℃
施工部位	K02 风机机位	旁站部位及工序	2#黄土防渗帷幕施工		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午5:50		

施工情况:

1. 技术负责人、质检员、安全员、施工员、安全员
2. 机械设施: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台。
3. 黄土防渗帷幕桩径为 400mm, 黄土防渗帷幕桩长 6.9m, 桩距 1.2m, 采用黄土防渗帷幕桩片处理。
4. 清淤土与土的体积配合比为 2:1, 2#黄土防渗帷幕。

检测情况:

1. 施工单位现场人员、机械设施到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理。
2. 人员安全保护措施到位, 机械设施安全防护措施到位。
3. 现场检测桩径和桩长 6.9m, 6.9m, 6.9m。
4. 施工单位及监理单位: 检测及处理系数 0.91, 0.98。
5. 设计总桩数 307 根, 回填成桩 41 根, 成桩材料: 2#黄土, 锤击次数: 5次 4次 5次。
6. 施工过程符合操作规范和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无


施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 5 月 25 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 25 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 062

日期	2019.5.26	天气	阴	气温	10-29℃
施工部位	1202 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.47m、6.4m、6.6m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 58 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次5次5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年5月28日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年5月26日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.27	天气	阴	气温	12-26℃
施工部位	1202 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	17:08:10	旁站结束时间	17:55:50		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.8m、6.4m、6.5m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 52 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次 5 次 4 次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查成桩孔长不符合设计

处理意见：

要补打 2 重新成孔 再检。

备注（包括处理结果）：

复核桩长符合设计

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 27 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 27 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.28	天气	晴	气温	10-25℃
施工部位	1202 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:8:5	旁站结束时间	14:5:40		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.43m、6.4m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 53 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无


施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 28 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 28 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 005

日期	2019. 5. 29	天气	阴	气温	11-27℃
施工部位	K02 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:10.	旁站结束时间	下午 6:10.		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.4m, 6.4m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 55 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 4次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 29 日

2019 年 5 月 29 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-006

日期	2019.5.30	天气	阴	气温	13-30℃
施工部位	K02 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 5:50.		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.47m. 6.62m. 6.51m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 48 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次 5 次 4 次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无


施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019 年 5 月 30 日

项目监理部（章）:

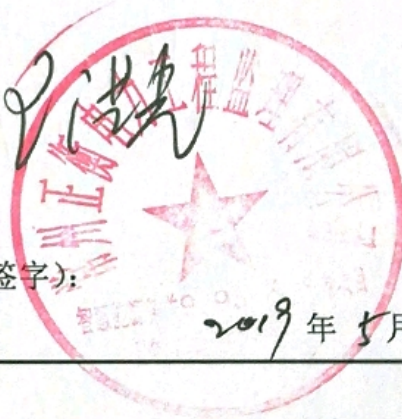

旁站人员（签字）:

2019 年 5 月 30 日
