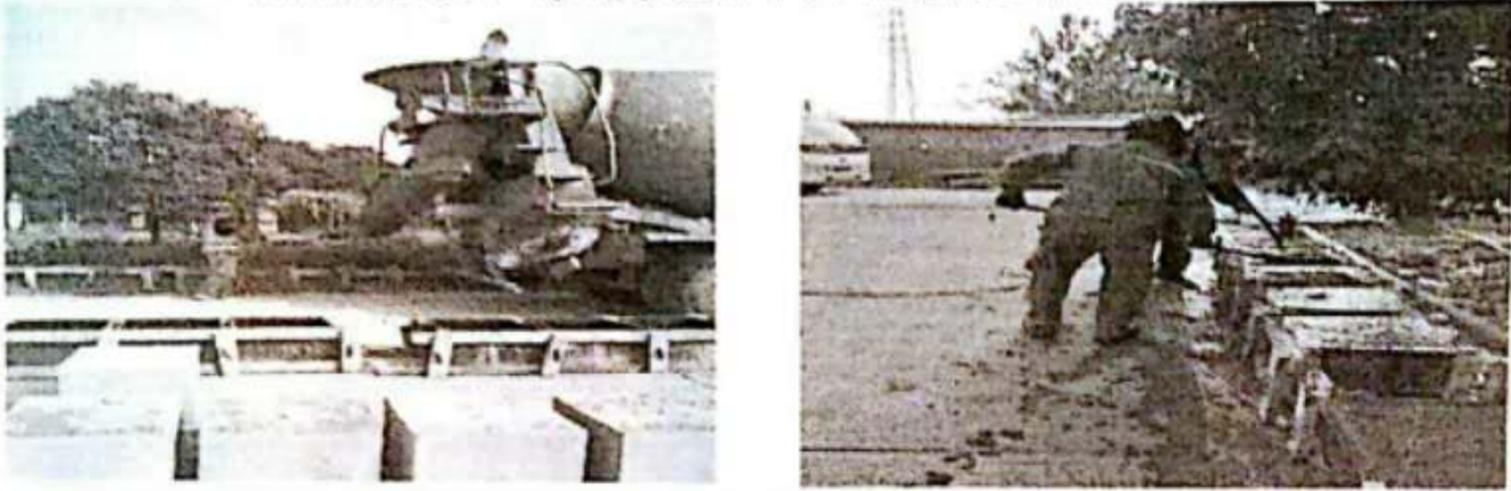


旁站监理记录表

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目 编号：TZZP-GCFK-01

日期及气候：2018 年 11 月 5 日晴 11-16℃	施工地点：冷藏间，分割间
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：17: 00
<p>施工情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 施工单位施工人员 12 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 7.5 方。 	
	
<p>监理情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。 	
<p>发现问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 基础砼表面未抹光。 	
<p>处理意见：</p> <p>1、安排人对基础表面立即重新找平抹光。</p>	
<p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="padding-left: 40px;">施工单位已整改完成。</p>	
<p>承包单位：<u>河南众森电力工程有限公司</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">质检员：<u>闫长松</u></p> <p style="text-align: center;">日期：2018 年 11 月 5 日</p>	<p>项目监理机构：<u>正衡监理</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">旁站监理人员：<u>李连明</u></p> <p style="text-align: center;">日期：2018 年 11 月 5 日</p>

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
