

旁站监理记录表

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目 编号：TZZP-GCFK-03

日期及气候：2018 年 11 月 11 日 晴 7-15℃

施工地点：物料间屋顶


旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑

旁站监理开始时间：8: 00

旁站监理结束时间：16: 00

施工情况：

- 施工单位施工人员 20 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为现场自拌混凝土，等级为 C25，汽车吊垂直运输砼，共计 16 方。

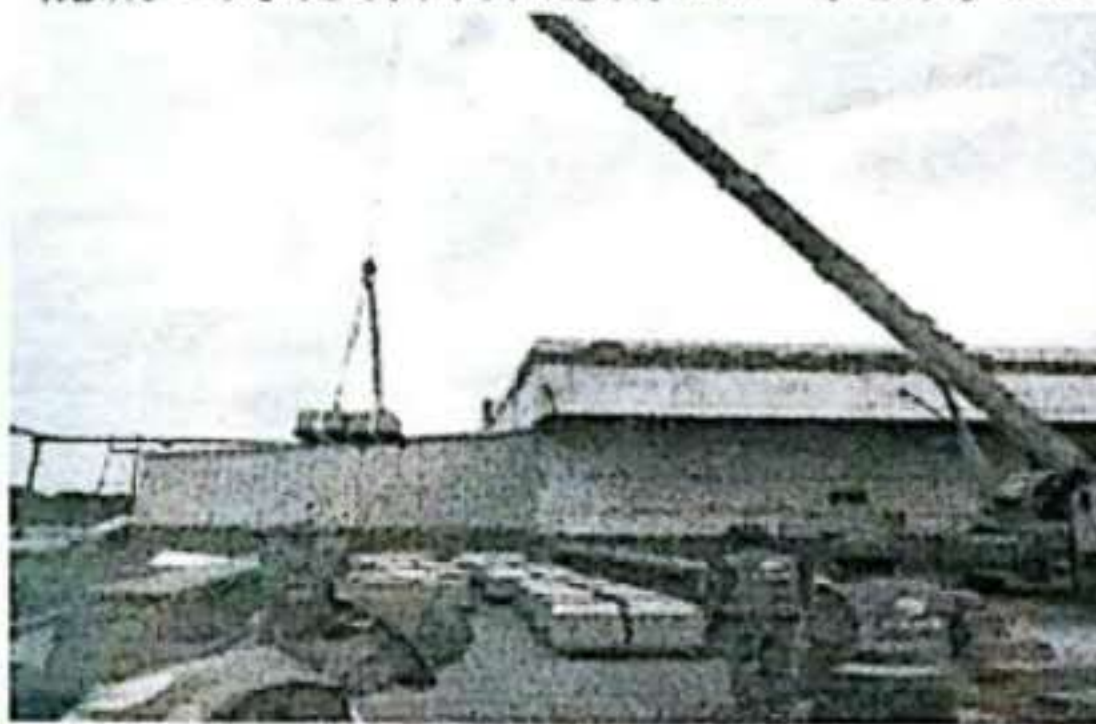

监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 基础预埋件个别位移。
- 基础砼表面未抹光粗糙不平。

处理意见：

- 1、安排人立即对砼基础、预埋件进行调整至位置。
- 2、安排人对基础表面重新找平抹光。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：河南众森电力工程有限公司

项目监理机构：正衡监理

质检员：阎长松

旁站监理人员：李连明

日期：2018 年 11 月 11 日

日期：2018 年 11 月 11 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
