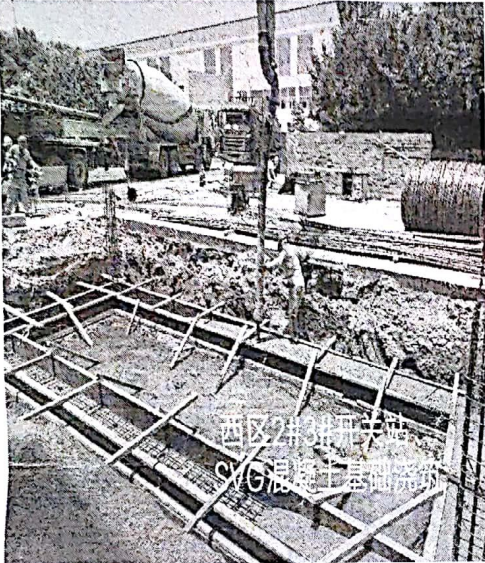
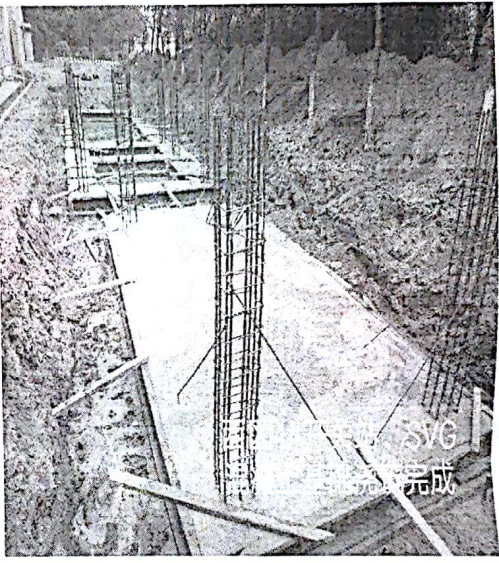


旁站记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及气候：2019 年 6 月 4 日 晴	施工地点：西区宽厚板、冷轧基础浇筑
旁站监理的部位或工序：宽厚板 2#3#开关站、SVG 基础浇筑、冷轧 4#开关站、SVG 基础浇筑	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：振动棒一台、商品砼 C30。 施工人员 8 人，泵车一台，管理人员 3 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。  	
监理情况： 1、施工人员到岗，设备试用情况良好。 2 测量基础钢筋，符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位： <u>中机国际</u> 质 检 员： <u>吴俊</u> 日 期： 2019 年 6 月 4 日	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>苏俊</u> 日 期： 2019 年 06 月 04 日
