

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及气候: 2019 年 6 月 9 日 晴

施工地点: 东区 5#箱变



旁站监理的部位或工序: 东区 5#箱变基础浇筑

旁站监理开始时间: 14:30

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。

施工人员 18 人, 泵车一台, 管理人员 2 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。

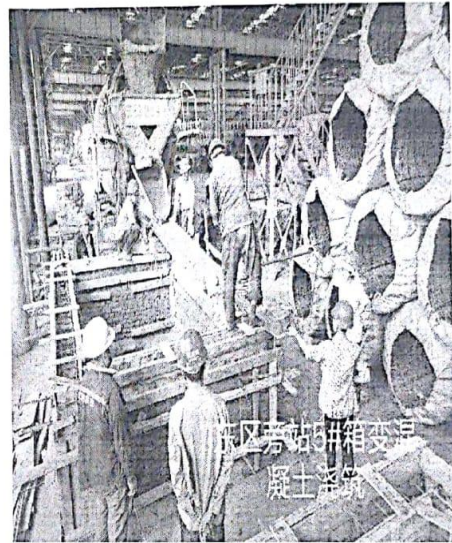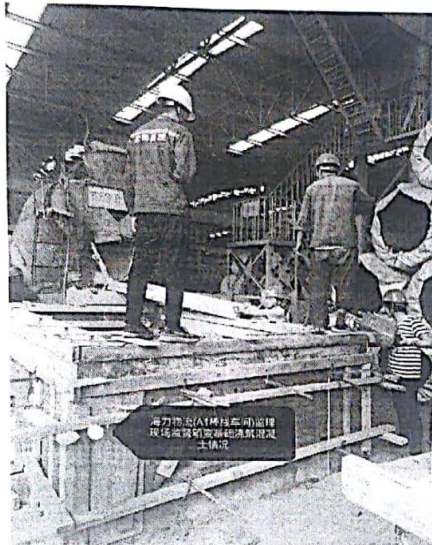

监理情况:

- 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。
- 2 测量基础钢筋, 符合图纸要求。
- 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。
- 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。

承包单位: 中核扬州

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 张明

旁站监理人员: 张明

日期: 2019 年 6 月 9 日

日期: 2019 年 6 月 9 日
