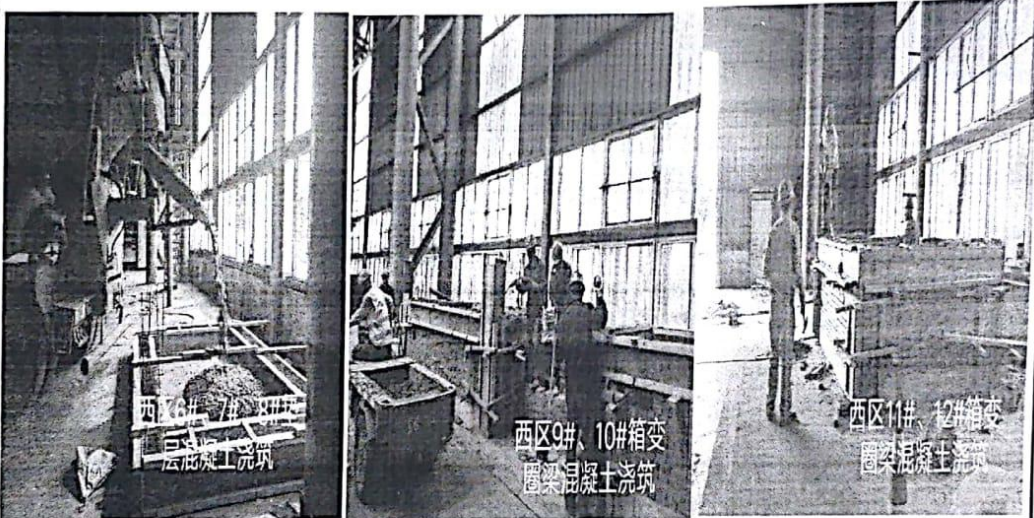


旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及气候: 2019 年 6 月 22 日 多云	施工地点: 西区 6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#箱变基础
旁站监理的部位或工序: 西区 6#-8#地圈梁浇筑、9#-12#顶圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。 施工人员 15 人, 泵车一台, 振动棒一台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2、测量基础钢筋, 符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 个别箍筋距离不符合设计要求	
处理意见: 要求施工方对不符合设计的箍筋进行调整	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: 中机国际工程设计研究院有限责任公司	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: <u>高玉有</u>	旁站监理人员: <u>苏付元</u>
日 期: 2019 年 6 月 22 日	日 期: 2019 年 06 月 22 日
