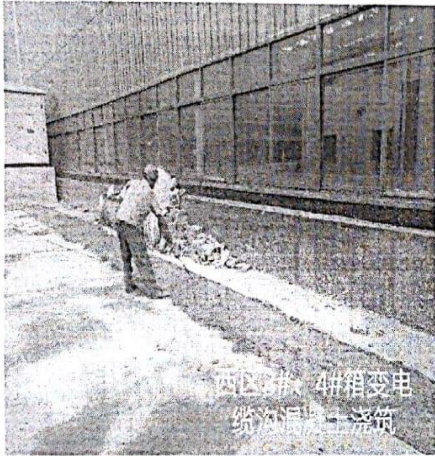


旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-011

日期及气候: 2019年6月23日 阴	施工地点: 西区3#、4#箱变; 2#、3#开关柜
旁站监理的部位或工序: 西区3#、4#箱变电缆沟浇筑; 2#、3#开关柜高压电缆破路	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。 施工人员 11 人, 泵车一台, 振动棒一台, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
 	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量电缆沟内钢筋, 符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 个别浇筑带未抹平	
处理意见: 要求施工方进行抹平处理	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: 中机国际工程设计研究院有限责任公司 质检员: <u>高士奇</u>	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>苏航</u>
日期: 2019年06月23日	日期: 2019年06月23日
