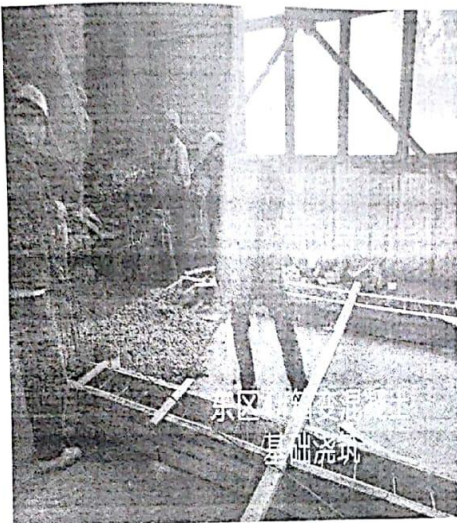
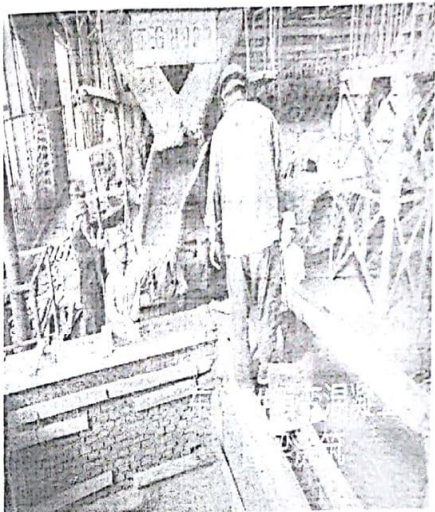


旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-017

日期及气候: 2019年6月12日 晴	施工地点: 东区 4#、8#箱变;
旁站监理的部位或工序: 东区 4#、8#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 12:30
施工情况: 施工人员 12 人, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。  	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量圈梁钢筋及箍筋情况, 符合图纸要求。 3、查看支模情况。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 发现浇筑后混凝土未填实	
处理意见: 要求施工方对浇筑后的混凝土振捣防止蜂窝麻面出现	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: 中机国际工程设计研究院有限责任公司 质 检 员: <u>苏军明</u> 日 期: 2019年6月12日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>魏树明</u> 日 期: 2019年6月12日
