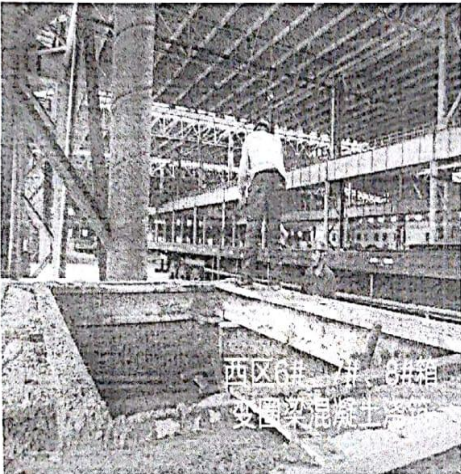


旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-008

日期及气候: 2019 年 6 月 27 日 多云	施工地点: 西区 6#、7#、8#箱变
旁站监理的部位或工序: 西区 6#、7#、8#箱变顶圈梁浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 14:30
施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。 施工人员 10 人, 泵车一台, 振动棒一台, 管理人员 2 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
 	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量基础钢筋, 符合图纸要求。 3、施工过程中施工方用振动棒进行振捣。 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。	
发现问题: 圈梁浇筑后混凝土未倒实	
处理意见: 要求施工方对混凝土进行全面的倒实处理	
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位: 中机国际工程设计研究院有限责任公司 质 检 员: <u>高玉有</u> 日 期: 2019 年 06 月 27 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>苏, 徐</u> 日 期: 2019 年 06 月 27 日
