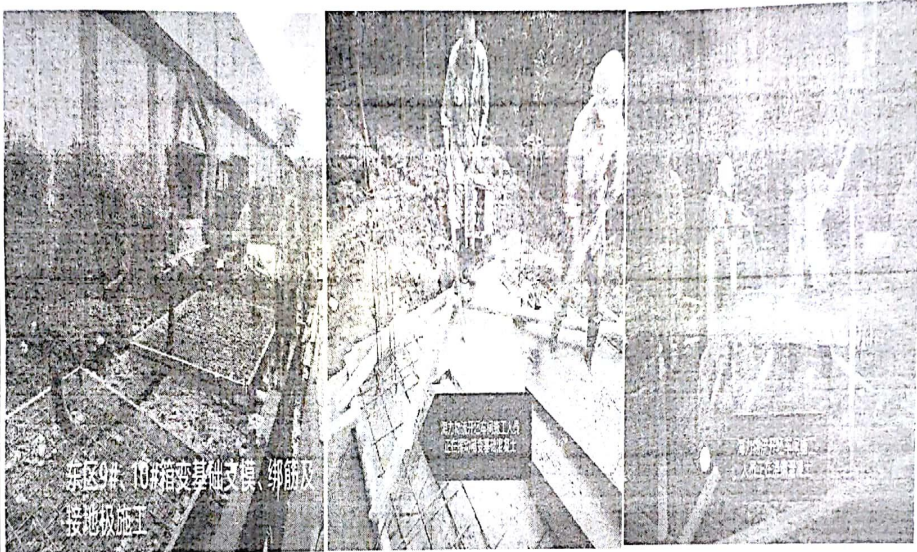



旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-022

日期及气候: 2019年7月18日 阴转小雨		施工地点: 东区9#、10#箱变基础浇筑及接地极	
旁站监理的部位或工序: 东区9#、10#箱变基础浇筑及接地极安装			
旁站监理开始时间: 9:30		旁站监理结束时间: 19:30	
施工情况: 振动棒一台, 商品砼 C30。 施工人员 8 人, 泵车一台, 挖掘机一台。管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。			
			
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。 2 测量基础开挖深度, 符合图纸要求。 3、测量基础绑筋情况符合设计要求, 测量接地极长度符合设计要求。 3、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。			
发现问题: 部分基础支模未达设计高度			
处理意见: 要求施工方对未达设计高度的支模进行加高处理			
备注 (包括处理结果): 浇筑结束后, 口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。			
承包单位: 中机国际工程设计研究院有限责任公司 质 检 员:  日 期: 2019年7月18日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  日 期: 2019年7月18日	
