

旁站监理记录表

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZSFZ-ZHJL-PZJL-003

日期及天气: 2019年6月13日

施工单位: 湖北飞友建设集团有限公司


旁站监理的部位或工序: 预制舱基础垫层浇筑

旁站监理开始时间: 14: 00

旁站监理结束时间: 16: 10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1.箱逆变基础浇筑, 施工前, 我部对钢筋尺寸进行复核, 符合图纸要求 12 间距为 200, 隐蔽工程进行拍照留档。
2. 对现场进行安全、施工技术交底
3. 现场采用自拌混凝土 (C15 标号), 配合比为水: 水泥: 砂: 石子 0.62: 1: 2.597: 4.946, 现场施工人数 5 人, 2 人管理, 一台铲车, 现场配备振捣
4. 现场按要求已做混凝土塌落度试验, 塌落度数据为 37 毫米, 符合规范要求

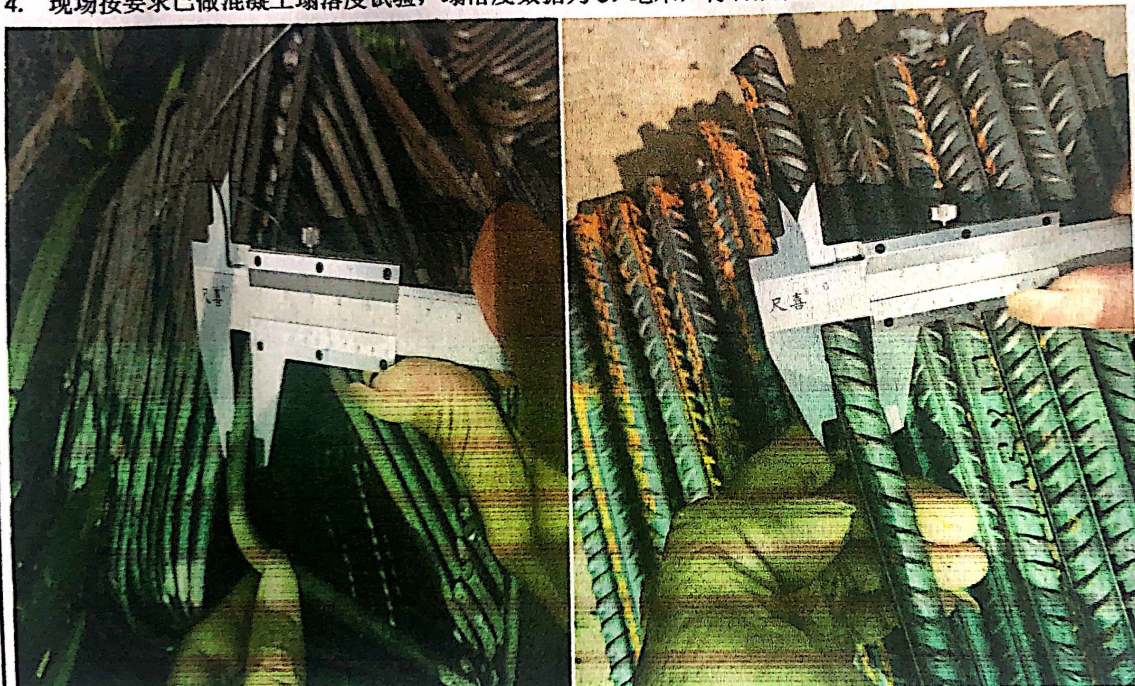

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字):

2019年6月13日



扫描全能王 创建
