


旁站 监 理 记 录 表

工程名称: 安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-HJX-PZ-002


日期及气候: 2019-04-23 阴 14/24℃	施工地点: 蔬菜区 30#、31#、32#
旁站监理的部位或工序: 电缆沟混凝土路面浇筑	
旁站监理开始时间: 17:00	旁站监理结束时间: 20:00
施工情况: 1、施工人员 6 人; 2、安全员、质检员已就位; 3、施工机具: 50 震动泵 1 台、铁锹等 ; 4、浇筑顺序及方法: 商混车布料→振实→平整→压实→压光→养护; 5、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时, 移位。	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 检查砼搅拌配合比, 各种材料送检资料齐全。 5. 砼坍落度实测值为 120 ±30 6. 振捣方法: 快插慢拔, 振捣点时间及移位符合要求;	
发现问题: 1、 混凝土振捣时间不够; 2、 有个别人不戴安全帽。	
处理意见: 1、 现场要求延长混凝土振捣时间。 2、 要求立即佩戴安全帽。	
备注: (包括处理结果): 处理结果符合要求。	
承包单位: 五洋电力建设股份有限公司 质检员 (签字):  日 期: 2019 年 04 月 23 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张建忠 日 期: 2019 年 04 月 23 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

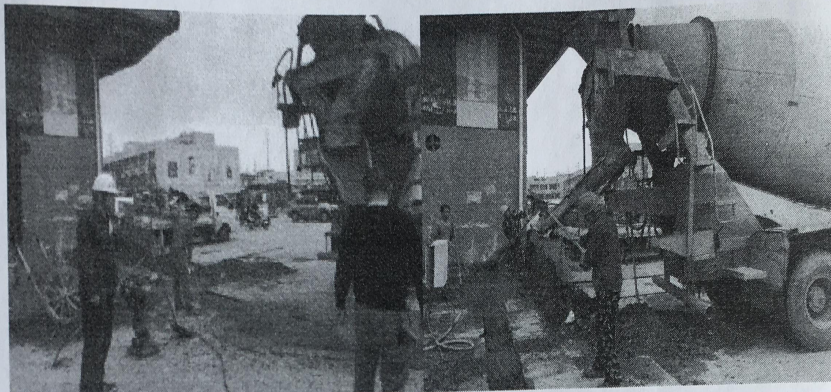

监理旁站

31#-30#砼浇筑

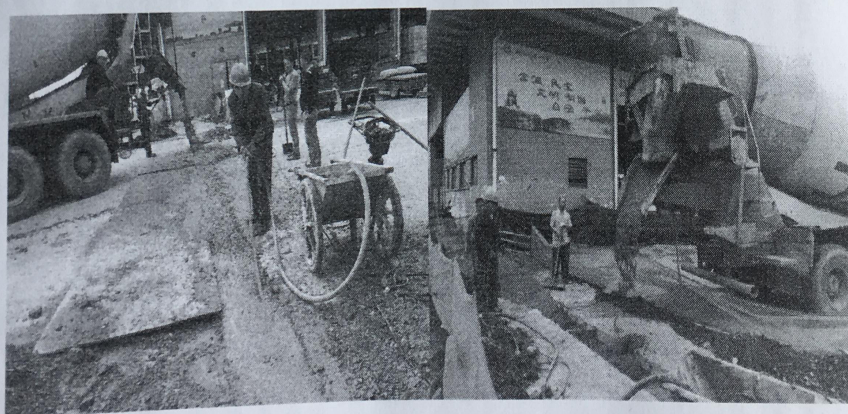

振捣

32#-31#砼振捣
