


旁站监理记录表

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-PZ-005

日期及气候：2019-06-11 晴 19/31℃	施工地点：蔬菜区 32#
旁站监理的部位或工序：斜撑加固	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 11、施工人员 9 人； 2、安全监护员已就位； 3、施工机具：磁座钻 1 台、电焊机 1 台、手拉葫芦 2 台、小型运输车 1 辆； 4、加固顺序及方法：切割→除锈→喷漆→打孔→安装； 5、安装时，按照图纸尺寸下料、基座螺栓位置准确打孔、安装斜撑、螺栓孔灌胶、两边基座螺栓紧固。	
监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 安全监护员已到岗、施工区域拉警示带； 3. 施工机械良好； 4. 检查安全带、设备等情况正常	
发现问题： 1、个别人员不戴安全帽； 2、个别斜撑基座与立柱缝隙较大。	
处理意见： 1、现场立即佩戴安全帽； 2、对缝隙较大的进行处理。	
备注：（包括处理结果）： 处理结果：等待下道工序。	
承包单位：五洋电力建设股份有限公司 质检员（签字）： 日 期：2019 年 06 月 11 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张建忠 日 期：2019 年 06 月 11 日


填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

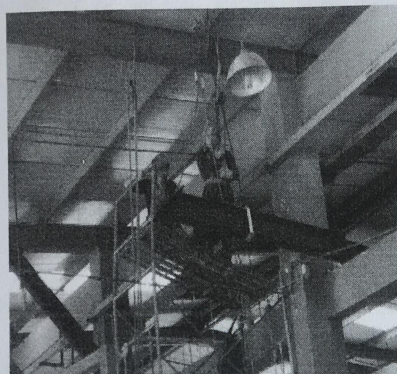

吊装



材料验收

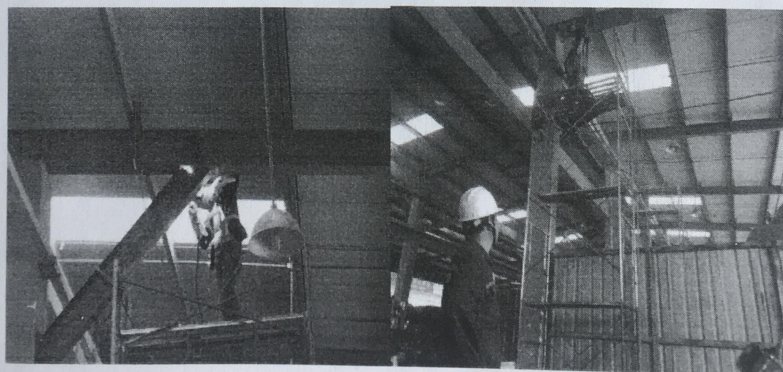

焊接

旁站
