


旁站监理记录表

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：CZZH-HJX-PZ-018

日期及气候：2019-11-16 晴 9/24℃	施工地点：蔬菜区
旁站监理的部位或工序：联络柜（08、09）240 电缆头制作、安装	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:20
施工情况： 11、施工人员 3 人； 2、安全员就位； 3、施工机具：液压钳 1 把、大剪刀 1 把、五指套等； 4、顺序及方法：电缆套热缩管、做电缆头、接线。	
监理情况： 施工人员已到位； 1、安全员到岗； 2、设备到位； 3、现场专人负责； 4、检查施工人员操作证。	
发现问题： 1、联络柜上桩带电，现场没有保护措施。	
处理意见： 1、要求做好安全保护措施，杜绝事故发生。	
备注：（包括处理结果）： 处理结果：已发出监理工程师通知单，要求做好保护措施，未发生安全事故。	
承包单位：五洋电力建设股份有限公司 质检员（签字）：[2/3] 日期：2019 年 11 月 16 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张建忠 日期：2019 年 11 月 16 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

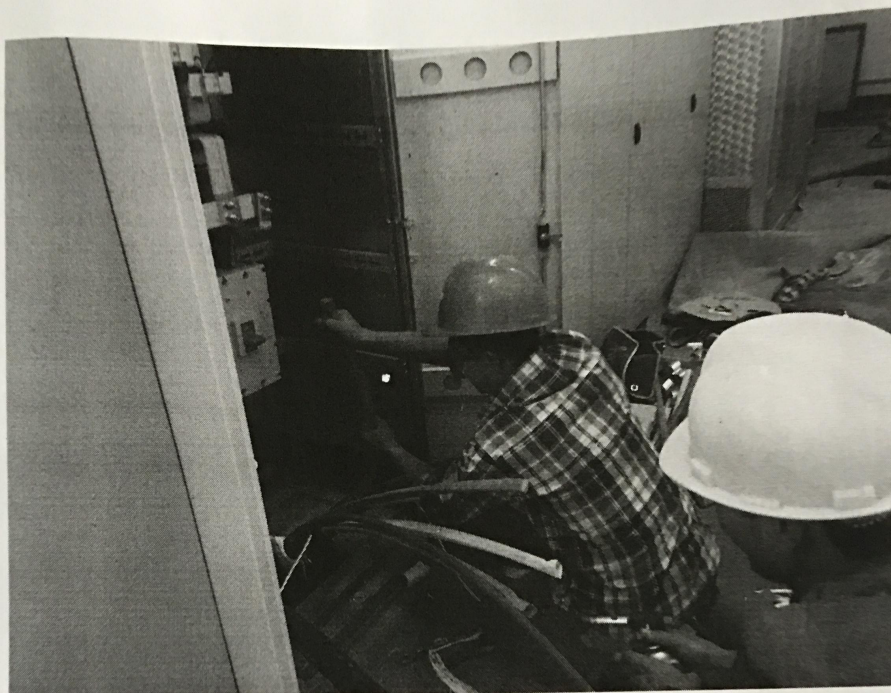

电缆头制作

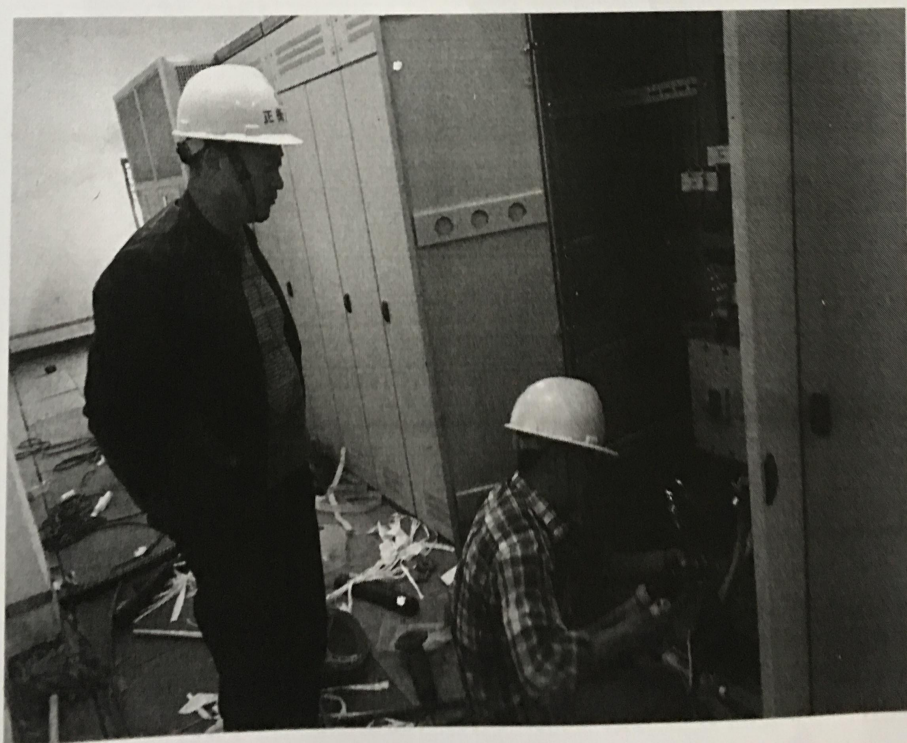

旁站
