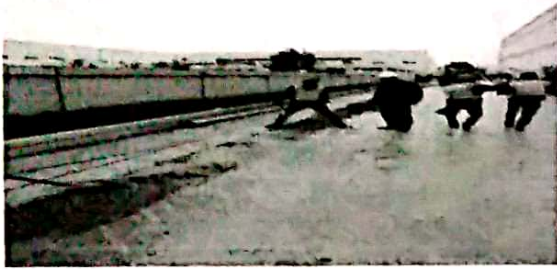


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-02

日期及气候：2019 年 5 月 9 日 晴 17-20℃	施工地点：配电房过路电缆沟
旁站监理的部位和工序：电缆沟路面砼浇筑	
旁站监理开始时间：13：30	旁站监理结束时间：18：00
施工情况： • 施工单位施工人员 6 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为商砼混凝土，等级为 C30，汽车自卸砼，共计 11.5 方。  	
监理情况： • 检查模板安装、埋管深度工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： • 电缆沟路面砼振捣不严。 • 路面砼找平时下雨。	
处理意见： 1、安排人立即重新使用振动棒振捣。 2、安排人对路面即找平抹光即覆盖薄膜防雨。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：中易建设有限公司 质 检 员：周阳 日 期：2019 年 5 月 9 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2019 年 5 月 9 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。
