


旁站监理记录表

表号: FD-B13



编号: ZHJL-PZ-087

项目名称: 赫章大山坪风电场项目

日期及气候: 2020-8-21 18:30/16°C	工程地点: 15#风机位.
旁站监理的部位或工序: 15#风机位浇筑基础混凝土	
旁站监理开始时间: 2020-8-21 22:30	旁站监理结束时间: 2020-8-23 5:30
施工情况: 1. 施工人数10名, 安全员、质检员各1名; 2. 37米泵车1辆, 商品混凝土罐车20辆, 振捣棒3台, 发电机1台, C40商品混凝土60m³ 3. 现场照明满足施工要求; 4. 旁站浇筑前施工项目部负责人对现场施工人员进行交底和技术交底	
监理情况: 1. 监理单位全程旁站浇筑混凝土浇筑全过程; 2. 旁站记录齐全, 符合规范要求, 现场预留试块 10组. 3. 施工人数、机械、照明满足施工需要.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位(章):  质检员: 孙家 2020年8月25日	监理单位(章):  旁站监理人员: 郭福清 黄振军 蔡经章 2020年8月25日



扫描全能王 创建

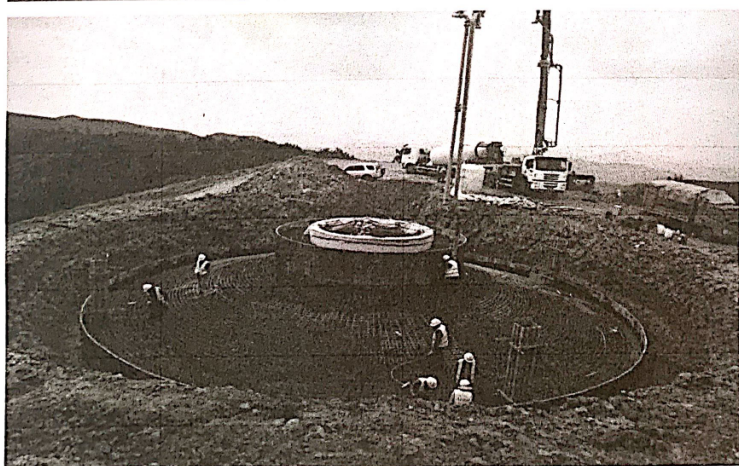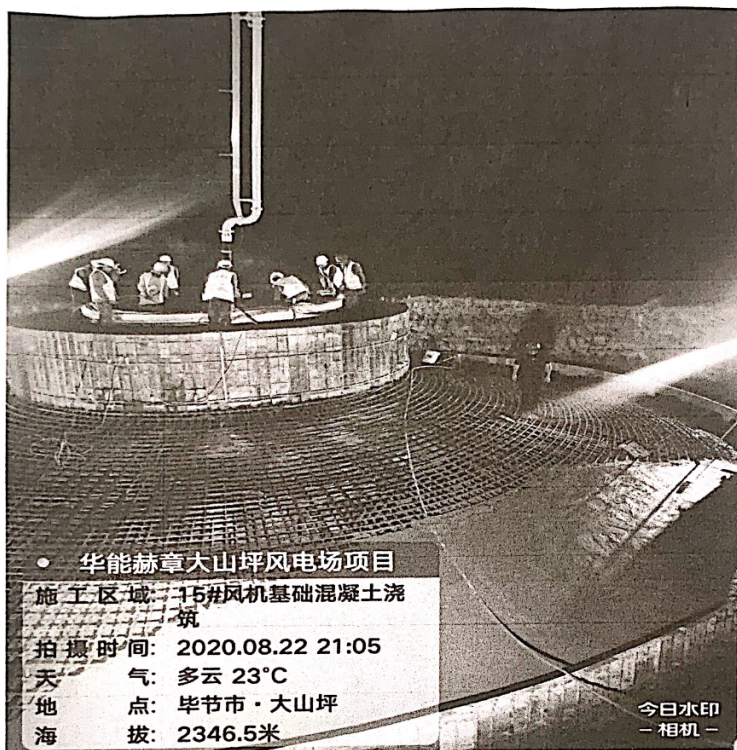

扫描全能王 创建
