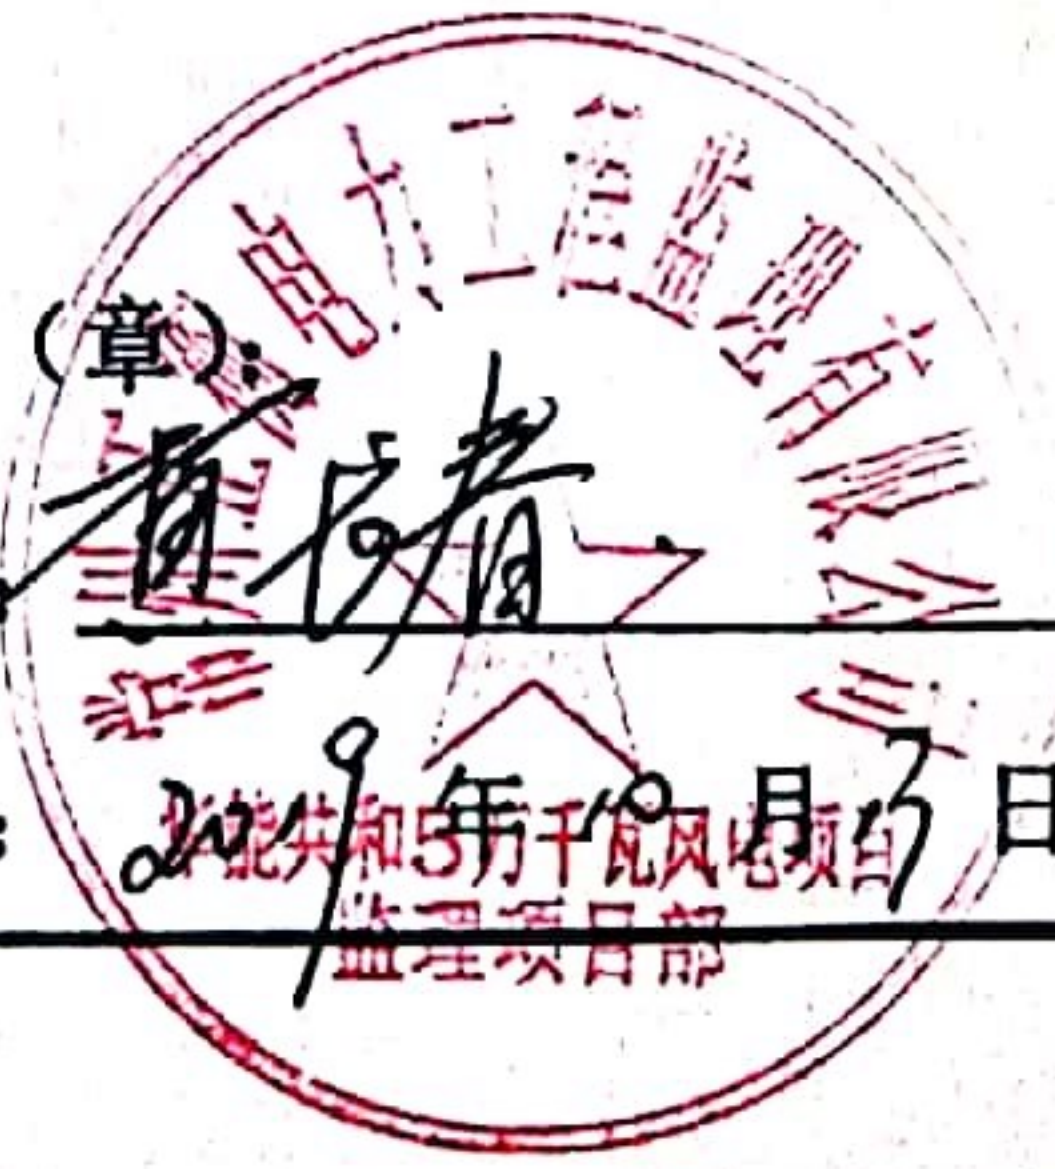


旁站监理记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FCM01-PZJL-0789

日期及气候：2019年10月13日 云-2-11℃		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：M14号风机基础浇筑			
旁站监理开始时间：2019年10月13日 07:40分		旁站监理结束时间：15:48分	
施工情况：施工人员：1人 管理人员：1人 到场。砼为商品混凝土C40泵车浇筑。浇筑过程符合规范要求。设计坍落度 $180\pm20\text{mm}$ 。泵车2台。插入式振动棒5条。发电机1台。			
监理情况： 现场检查坍落度为：170mm 实时测温为：0℃ 混凝土温度为：13.7℃ 入仓温度17.6℃。浇筑量为：556 m^3 。在浇筑过程中支撑模板牢固。无漏浆。使用的混凝土为：C40。现场试块7组。			
发现问题： 部分区域有漏振现象。			
处理意见： 要求施工单位进行补振。			
备注（包括处理结果）： 施工单位补振符合要求。			
 承包单位（章）： 质检员：王兴 日期：2019年10月13日		 项目监理机构（章）： 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019年10月13日	
