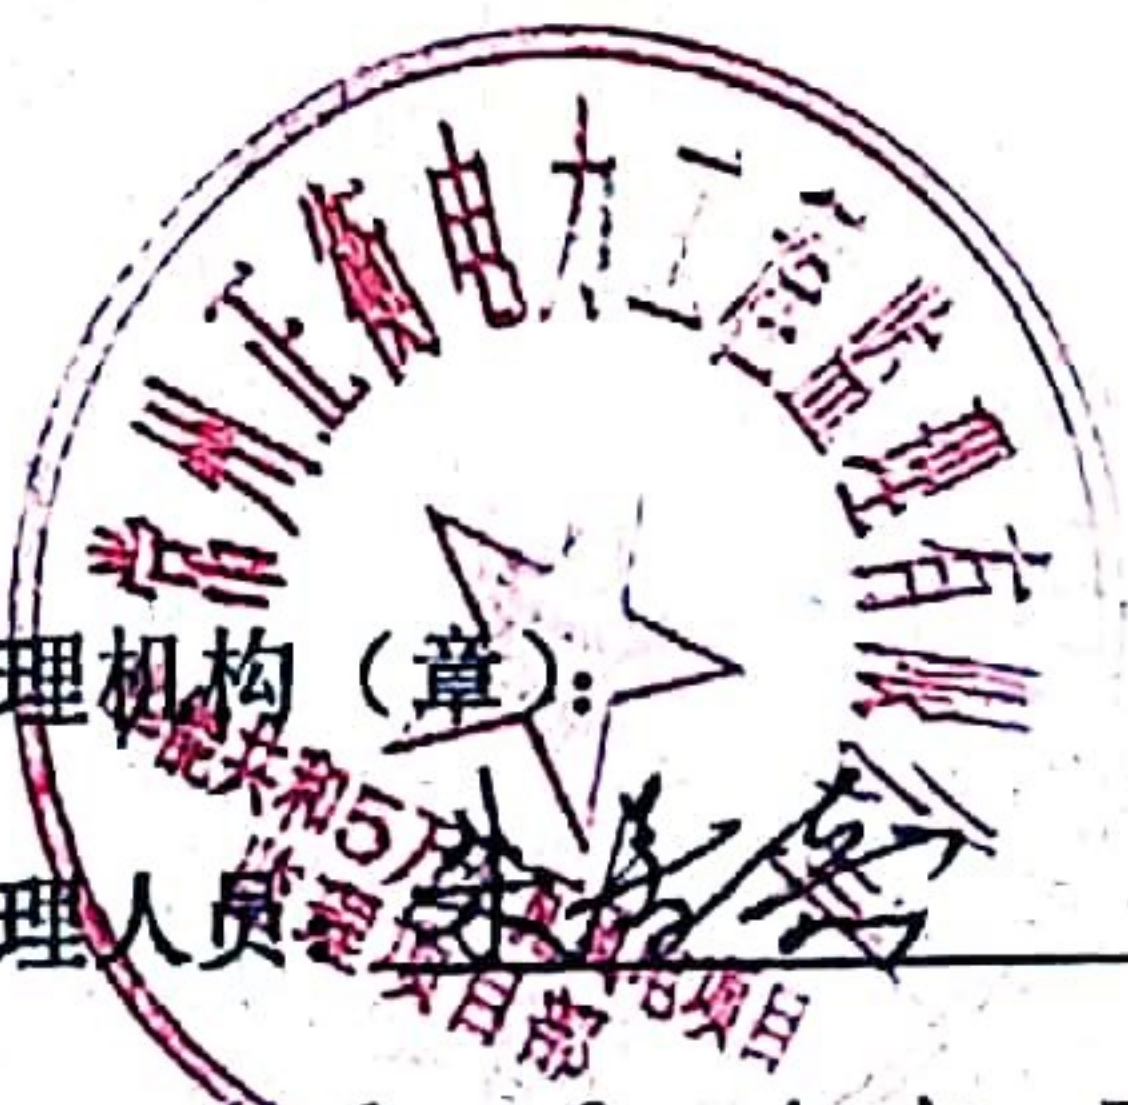


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PZJL-084

日期及气候：晴气温 -6℃~13℃ 2019年10月18日		施工单位：山东电力建设第三工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：10kV 电场内 20# 19# 箱变基础浇筑砼。			
旁站监理开始时间：2019年10月18日下午1:30		旁站监理结束时间：2019年10月18日下午11:30	
施工情况：现场施工人数6人。施工机械振动棒2台、发电机一台、砼罐车1辆、施工采用C35商品砼，施工人数、机械设置满足施工要求，施工部位各管理人员现场指挥，班前做了技术交底，各施工人员分工明确，施工方法与方案一致，施工过程正常，未出现意外情况。砼方量14m³。			
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，现场施工用电设备安全可靠，施工方案已报监理部审查批准，钢筋、模板已验收合格。同意浇筑砼，检查砼到场时间致浇筑完成未超时，见证提取C35砼试块标准养护2组、同条件1组，实测砼坍落度1次，195mm，符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位（章）： 质检员：王洪 日期：2019年10月18日		项目监理机构（章）： 旁站监理人员：徐嘉豪 日期：2019年10月18日	
