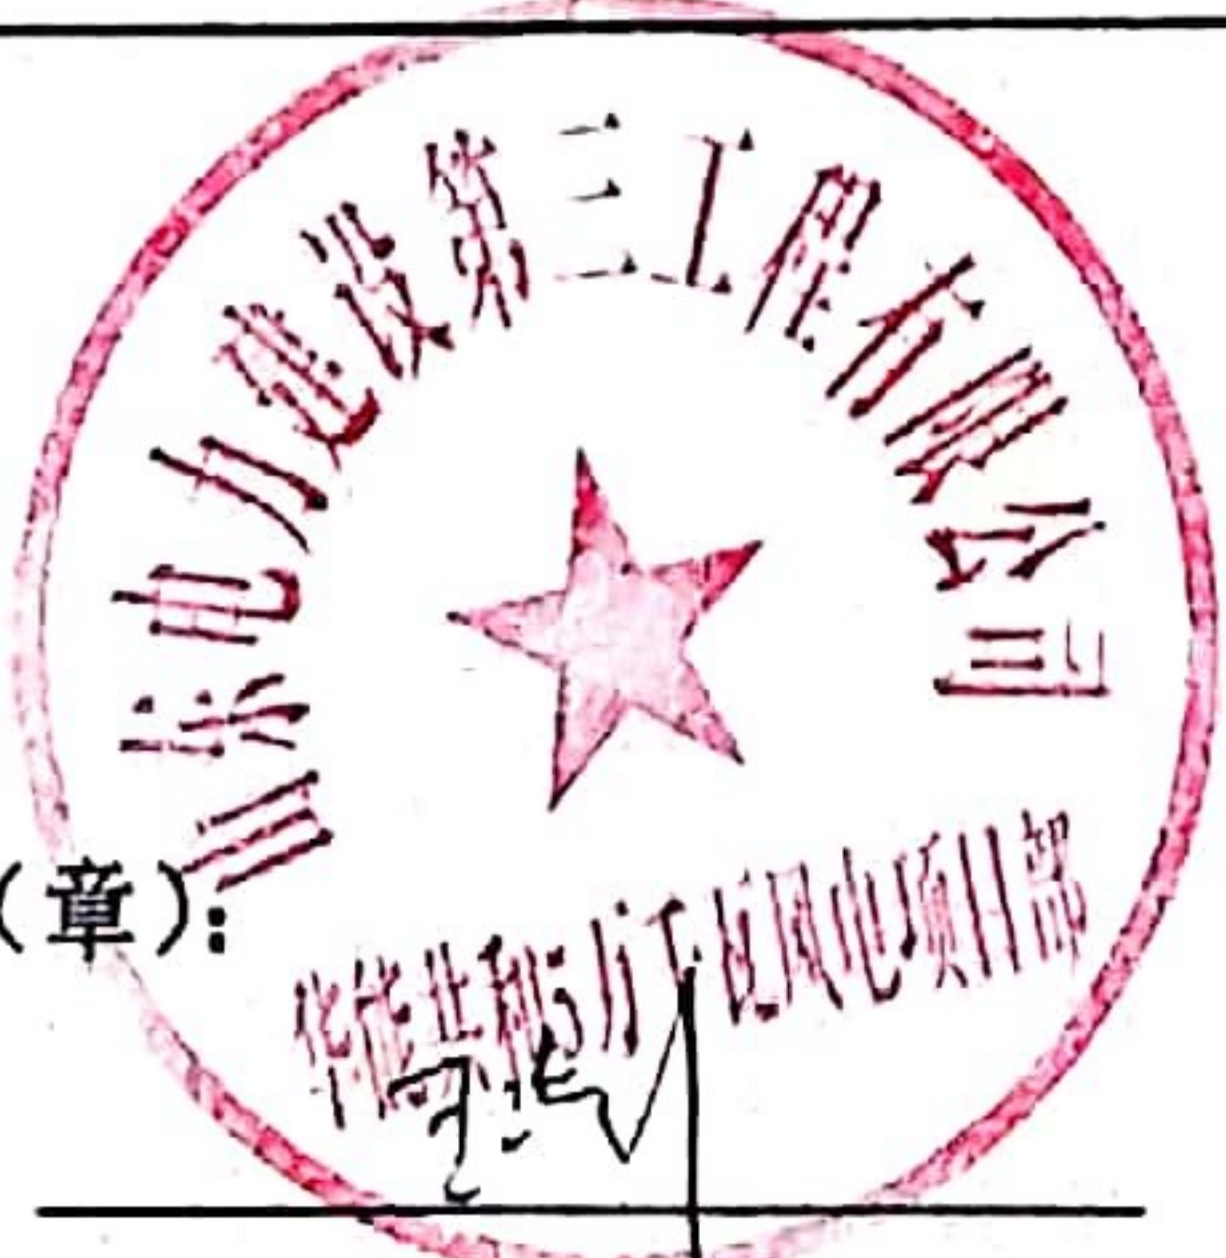
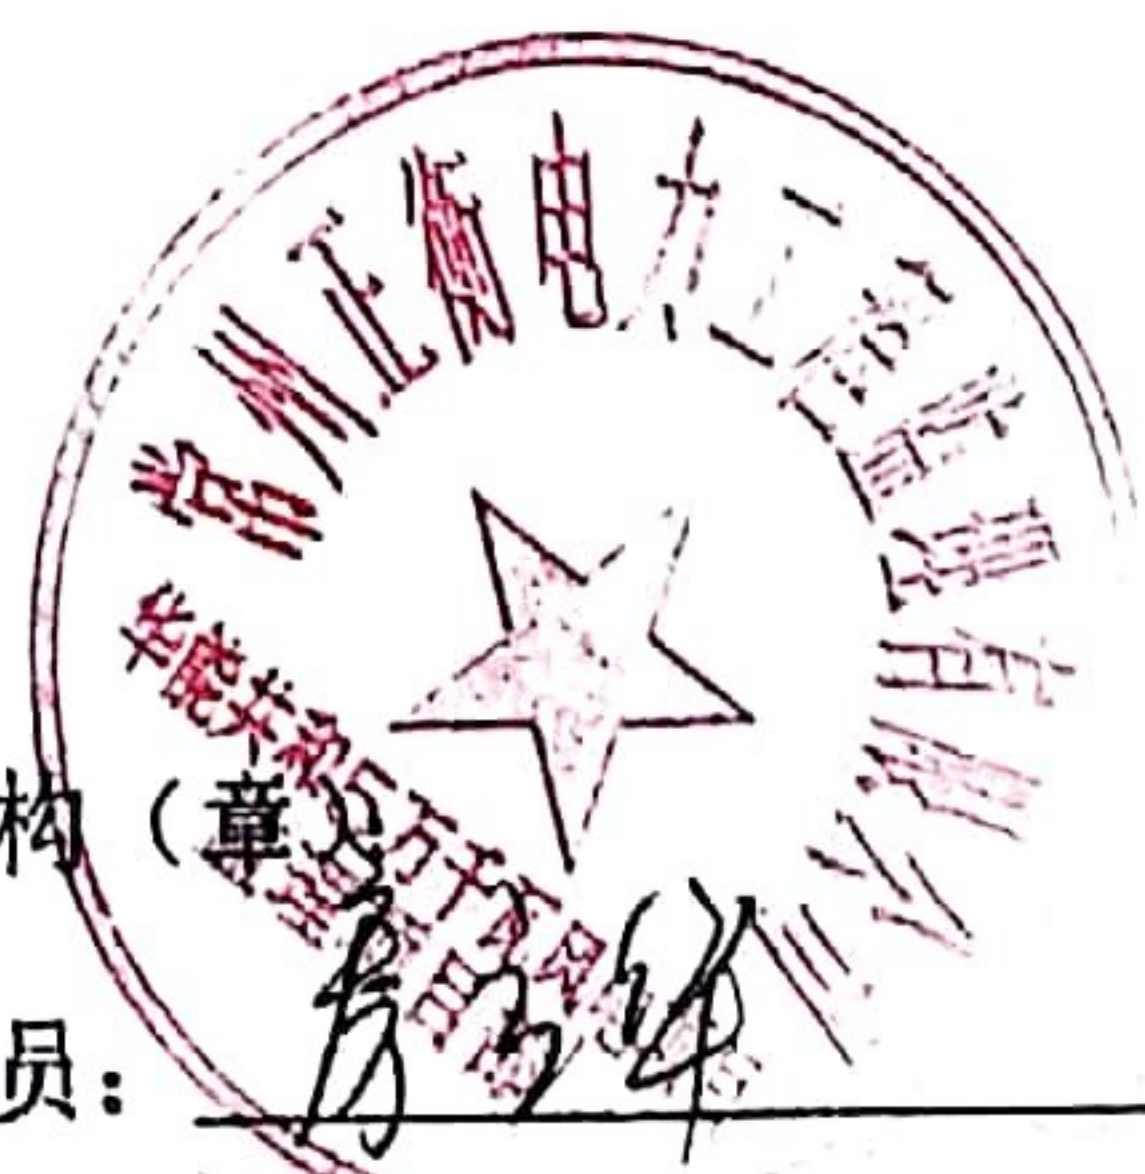


旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PZJL-117

日期及气候：2018.11.12. 晴天~-8℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5号. 塔筒机基土方回填	
旁站监理开始时间：上午 9:00	旁站监理结束时间：下午 17:00
施工情况：施工方配备各专业工友满足施工要求，施工机械运转正常，铲车一台，打夯机一台。采用基坑原土进行回填。	
监理情况：回填前监理检查了基坑内无积水无垃圾，基础局部验收合格，同意回填，要求按方案分层回填，厚度在30cm以内，分层夯实回填。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质检员：_____ 日期：2018年11月12日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：房立峰 日期：2018年11月12日
