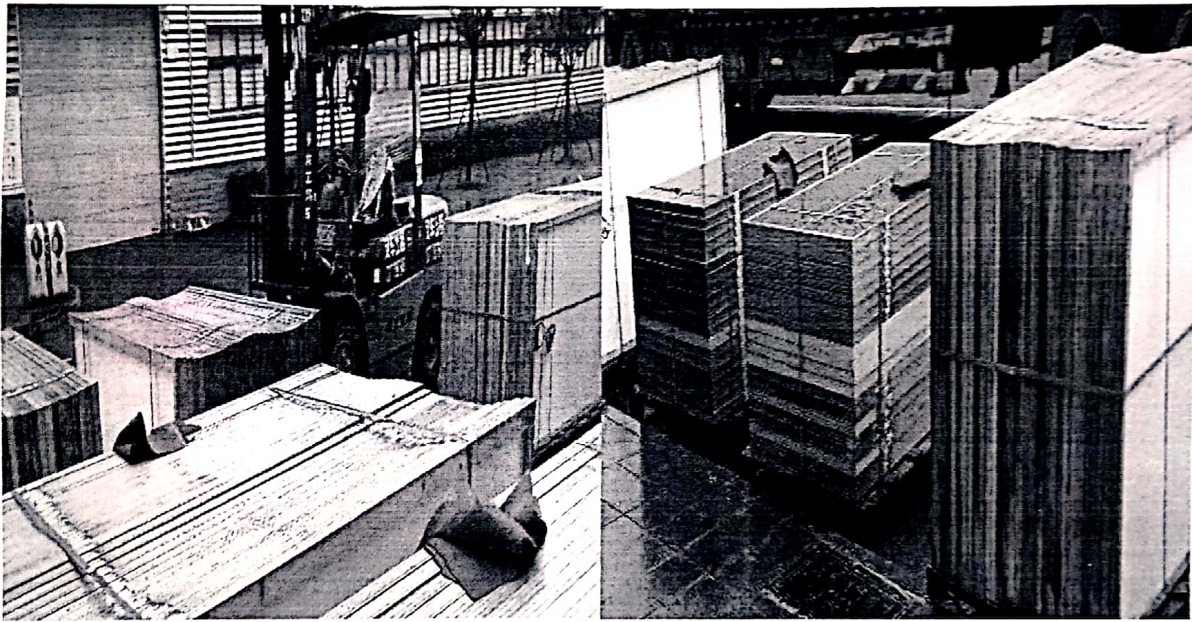



旁站监理记录表

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：WPQC-ZHJL-PZ-004

日期及天气：2019 年 07 月 10 日 多云 21° - 26°	施工单位：江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序：试验中心楼下旁站组件卸车	
旁站监理开始时间：6: 50	旁站监理结束时间：8: 20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，3 吨叉车 1 辆； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底； 3、业主项目经理和监理到场旁站	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 甲方提供的组件共计 17 拖 490 块，全部没有外包装，没有任何资料文件，铝合金边框存在严重的锈迹。 处理情况：此批组件严禁施工，待业主项目经理协调好以后才可以施工。	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 07 月 10 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建
