

旁站监理记录表

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及气候: 2019.8.31

晴

施工单位: 江苏文正工程有限公司


旁站监理的部位或工序: 3号屋顶条形基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 10:00

施工情况:

- 1、施工单位施工人员 17 人, 施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为自拌混凝土, 等级为 C25, 共计 9m^3 。

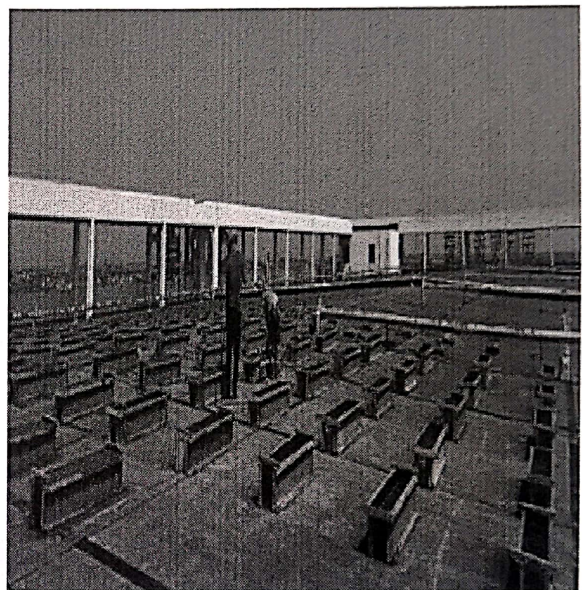

发现问题:

部分基础振捣时间不足

处理意见:

要求增加振捣时间

旁站监理人员 (签字): 严是进

2019 年 8 月 31 日
