

旁站监理记录表

工程名称:北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目


编号:JXM6-ZHJL--024

日期及天气: 2019.08.13 晴	施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次舱设备基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2019.08.13 下午 15 点 40 分	旁站监理结束时间: 2019.08.13 下午 16 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、升压站一次舱设备基础混凝土浇筑; 2、施工人员 6 人,施工机械:混凝土灌车、吊车 1 辆、料斗 1 个、振捣器 2 台、发电机 2 台,浇筑顺序及方法:按照施工方案、操作工艺施工; 3、施工工具:插入式振动棒 1 根、铁锹、木抹子、钢抹子; 4、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗,安全员进行班前喊话及风险评估,劳动保护安全措施到位; 5、混凝土浇筑过程符合设计要求;	
发现的问题及处理情况: 1、质检员已到位。 2、施工机械良好。 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全。 4、混凝土塌落值 符合要求。 5、振捣方法:紧插慢拔,振捣点布置成梅花形,振捣间距不大于 500mm;振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固,未发现涨模、跑模现象。	
旁站监理人员(签字):王明官	
2019年8月13日	

注:本表一式一份,监理项目部留存。



扫描全能王 创建

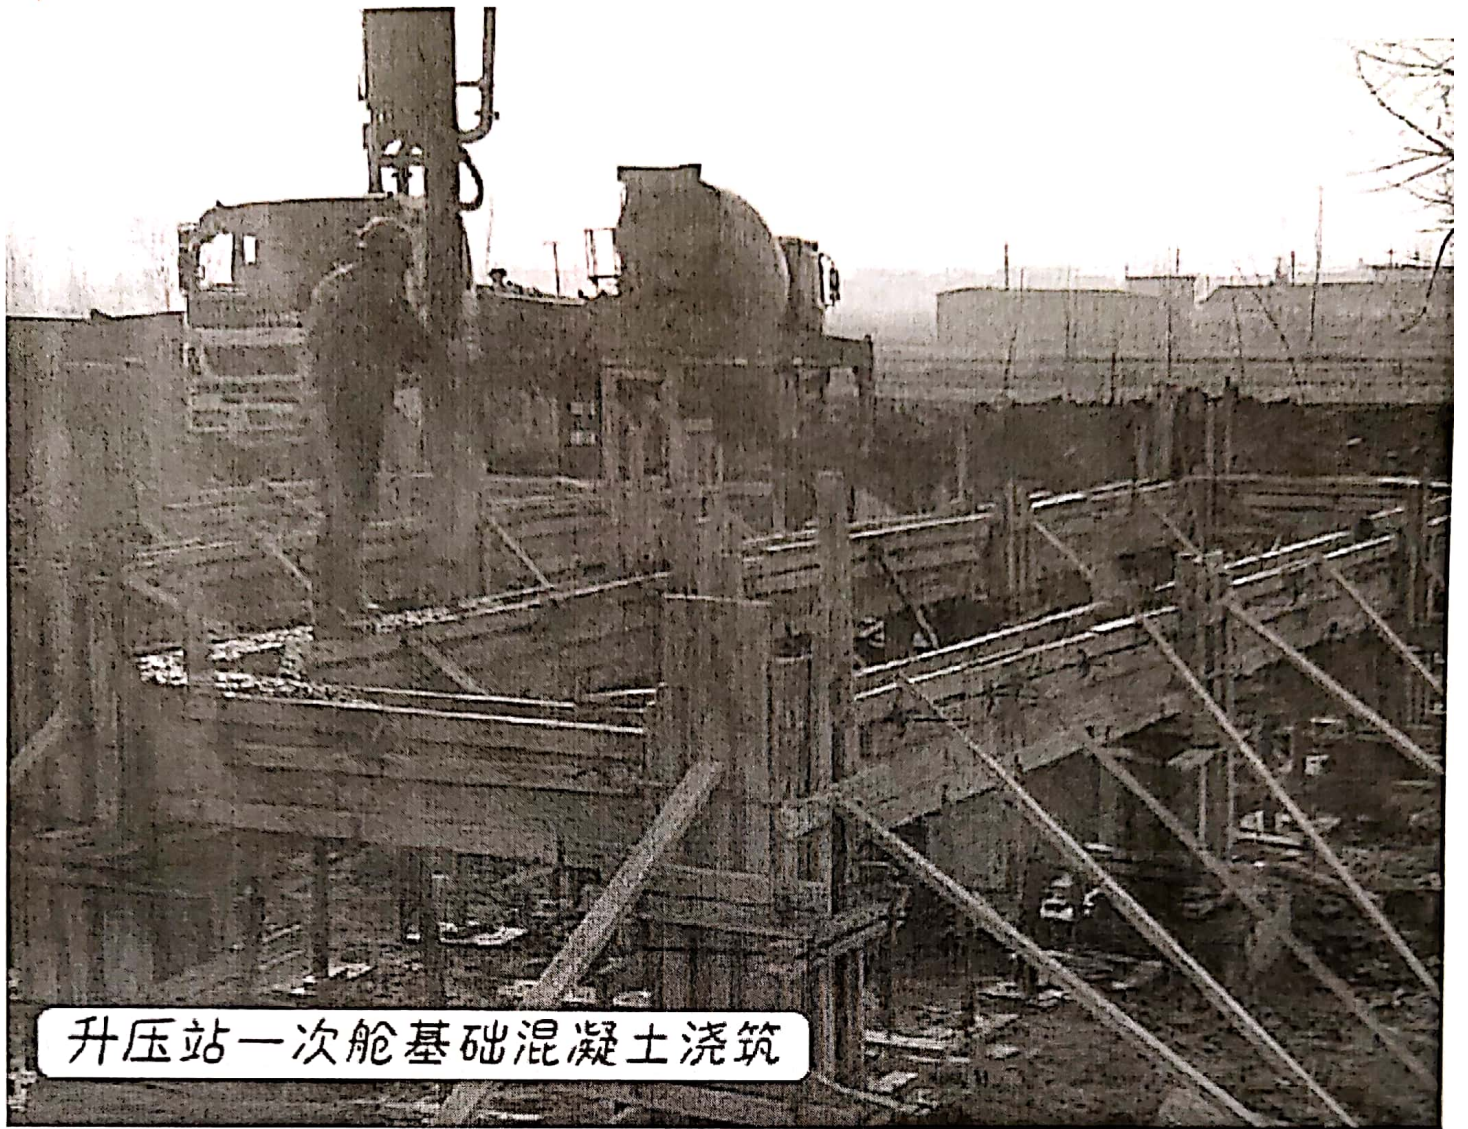

升压站一次舱基础混凝土浇筑

