

旁站监理记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目


编号：JXM6-ZHJL--030

日期及天气:	2019.11.18	多云	施工单位:	江苏溧阳建设集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次舱到隔离开关 3×95 的 35Kv 终端电缆头制作				
旁站监理开始时间:	2019.11.18	上午 9.00	旁站监理结束时间:	2019.11.18 上午 11.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、3×95 高压电缆，2、现场施工 2 人，3、电缆线鼻，一台压缩器，冷缩三芯终端。				
关键工序施工: 检查电缆—现场作业准备—电缆剥皮—套入线鼻、压实一套入电缆三芯终端及保护套				
发现的问题及处理情况:				
旁站监理人员(签字): 孔令才 2019 年 11 月 18 日				

本表一式一份，监理项目部留存。



扫描二维码
扫描二维码

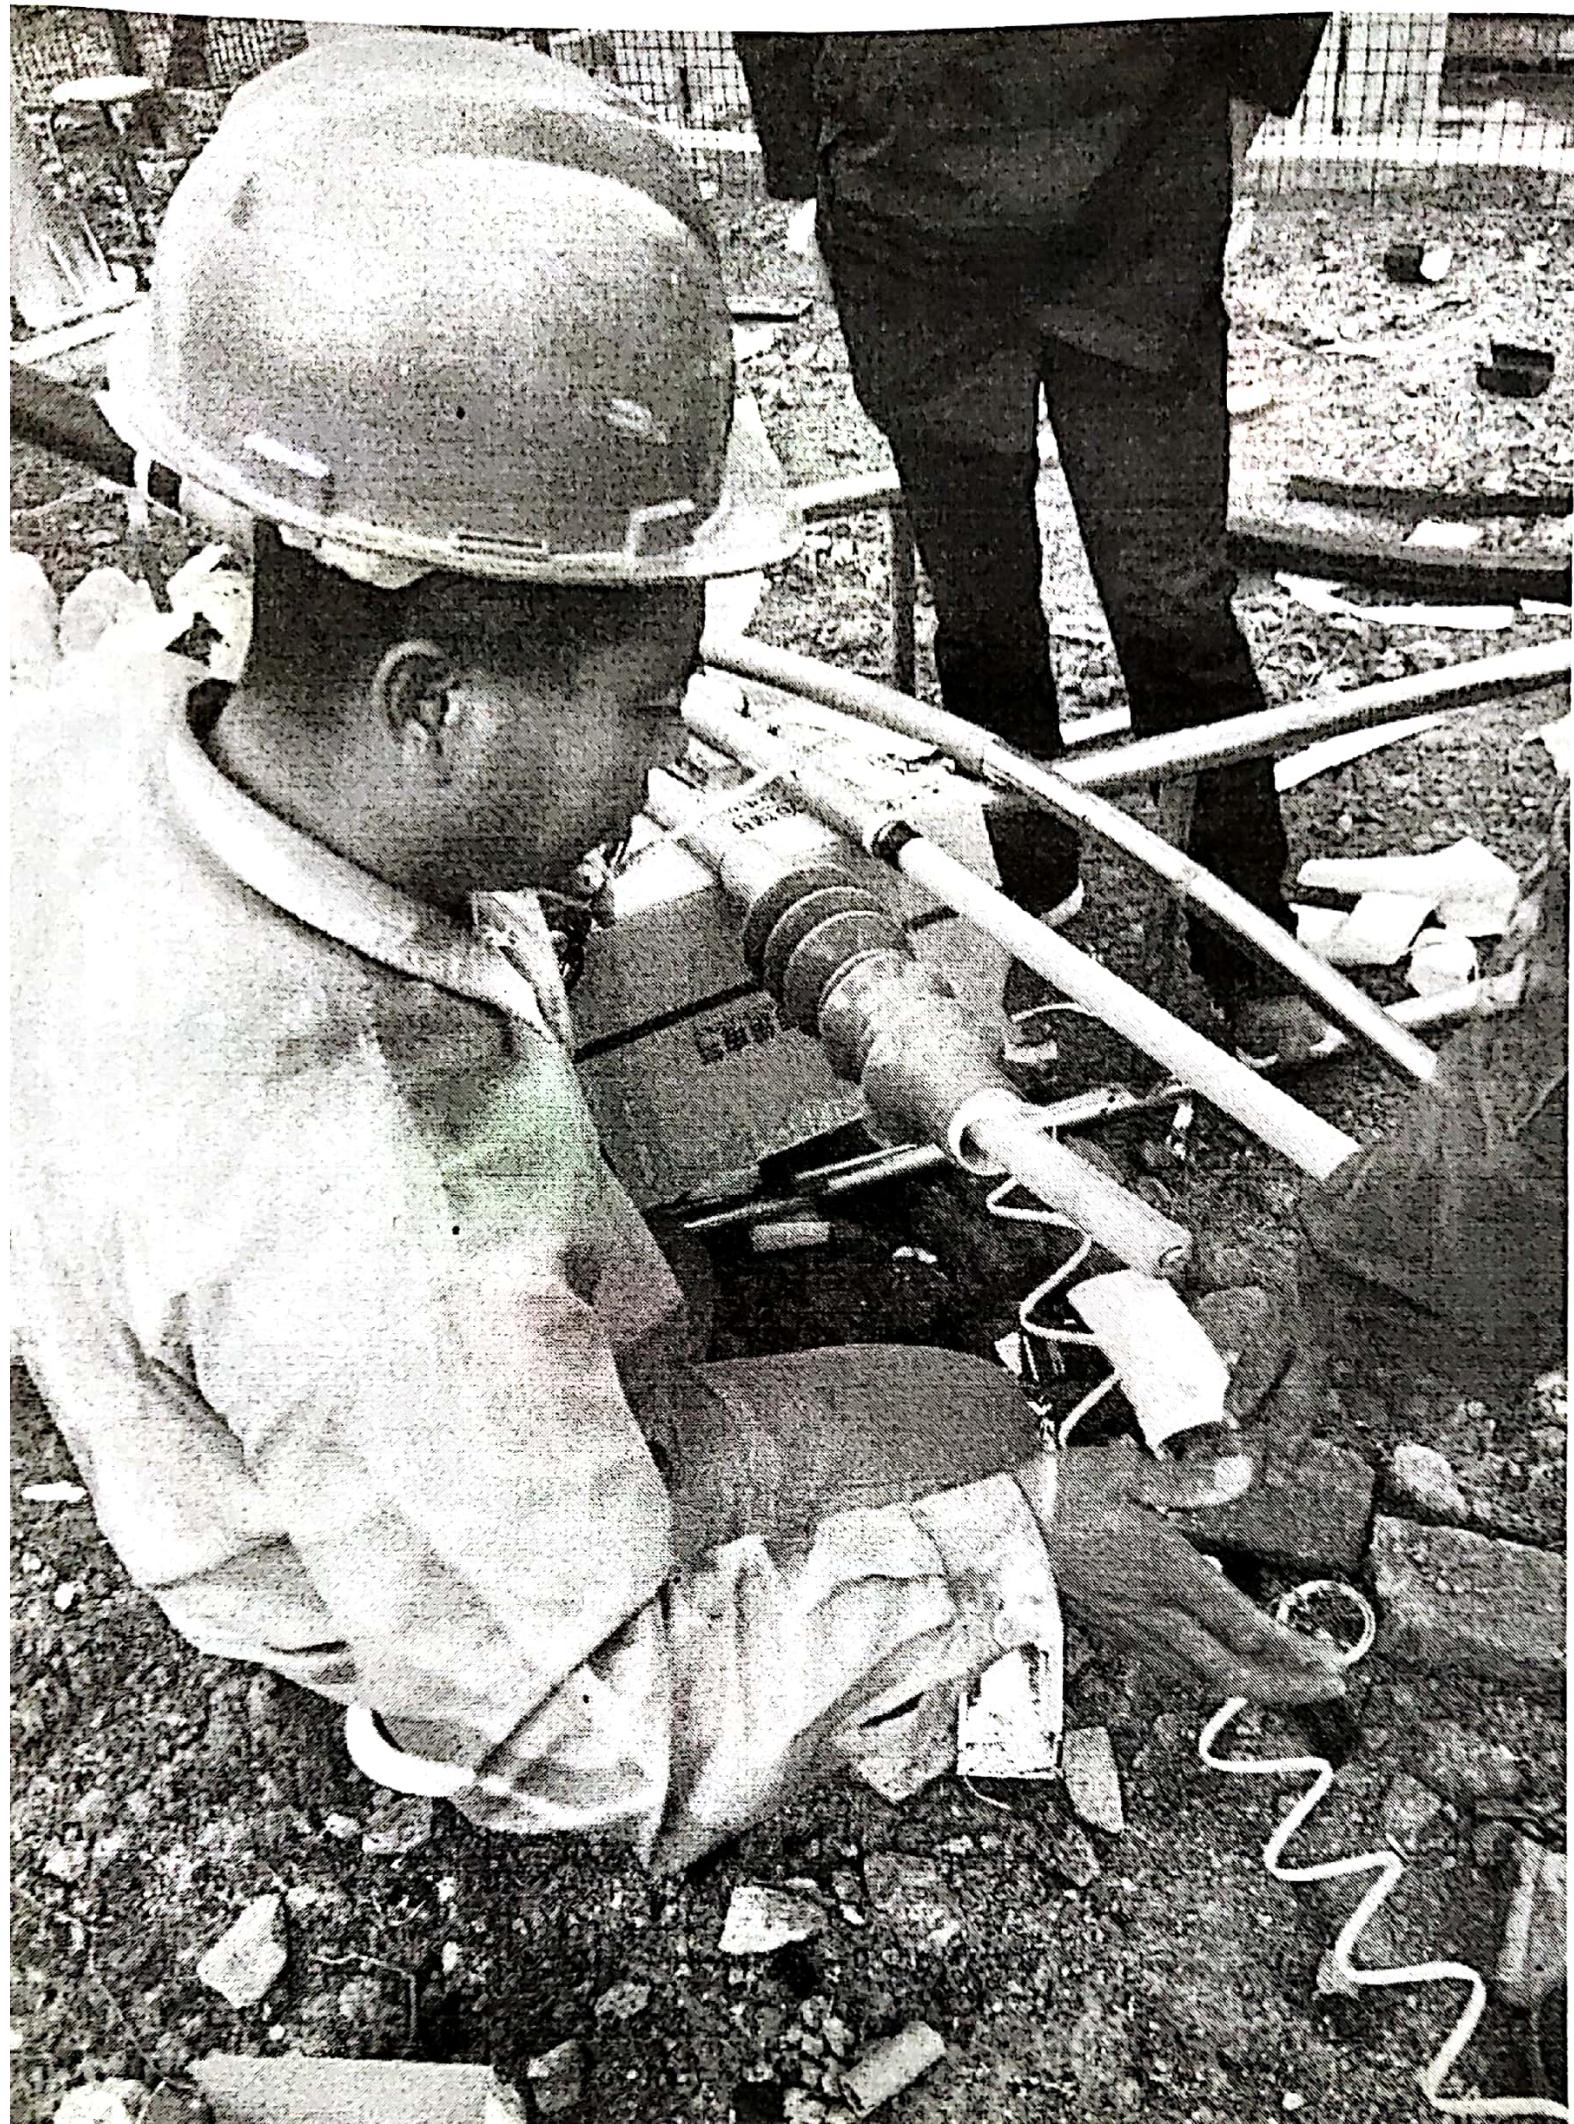

扫描全能王 创建
