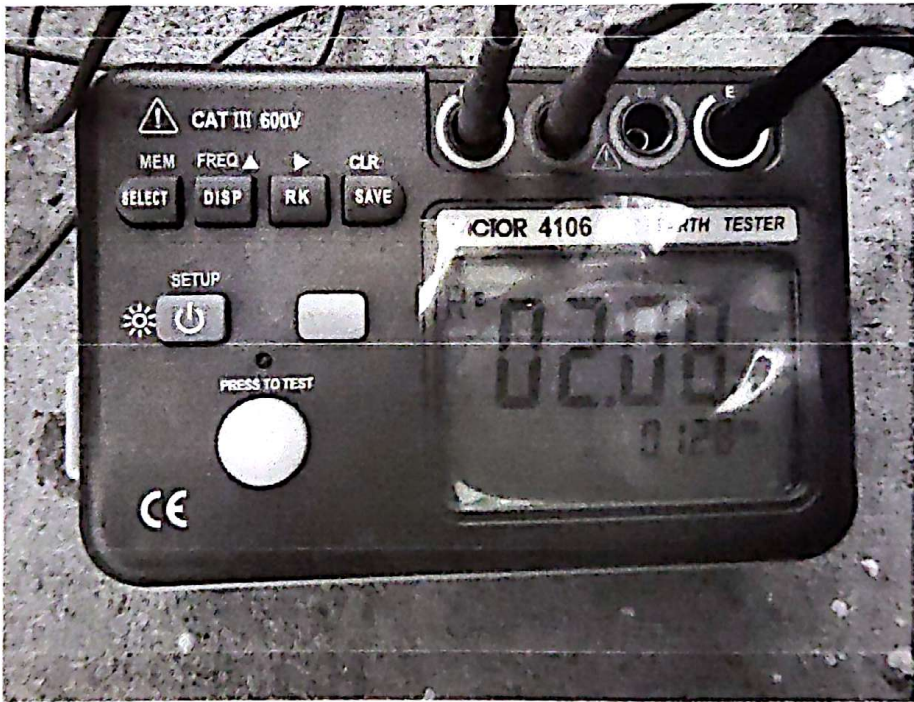


旁站监理记录表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-PZJL-15

日期及天气：2020 年 01 月 01 日	施工单位：江西嘉霖建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：二号厂房测量接地电阻	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场施工 4 人，一台接地电阻测试仪、一把 30 米卷尺。 2、关键工序施工：测量接地极之间的距离—打入辅助接地棒—配线—使用接地电阻测试仪测试电阻—J 记录读数	
	
发现的问题及处理情况： 未发现异常，符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 丁建 史光辉	
