


旁站监理记录表


工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-002

日期及气候：2019.10.08 晴 12℃-19℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位或工序： 支架管桩施工	
旁站监理开始时间：2019.10.08 14:00	旁站监理结束时间：2019.10.08 16:10
施工情况： 1. 施工人员 8 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 施工人员到达现场，打桩机、工器具准备完毕 3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。	
监理情况： 1. 已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。 2. 桩基施工中严格控制锤击力度，控制送桩深度，避免倾斜偏差； 3. 施工中已安排技术人员随时检查。	
发现问题： 部分管桩施工发生倾斜，垂直度不符合设计要求。	
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度。	
旁站监理人员：  2019 年 10 月 08 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__



扫描全能王 创建

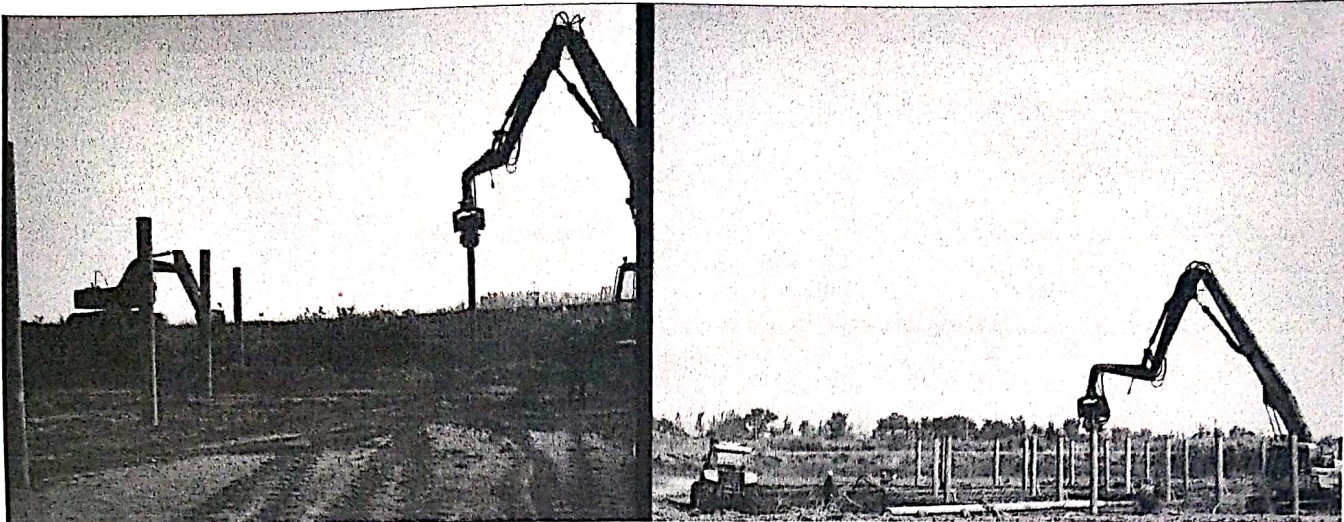

扫描全能王 创建
