

旁站监理记录表


工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-005

日期及气候：2019.11.03 阴 7℃-25℃	施工地点：柔性支架光伏区
旁站监理的部位或工序：箱变基础平台浇筑	
旁站监理开始时间：2019.11.03 8:30	旁站监理结束时间：2019.11.03 10:30
1、施工人员 20 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、砼为商品混凝土 c30； 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 4、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； 5、留试块 1 组。	
发现问题： 混凝土钢筋保护层未完成。	
处理意见： 已现场要求施工单位立即整改，整改完成后再浇筑施工。	
旁站监理人员：严足贤 2019 年 11 月 03 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__



扫描全能王 创建

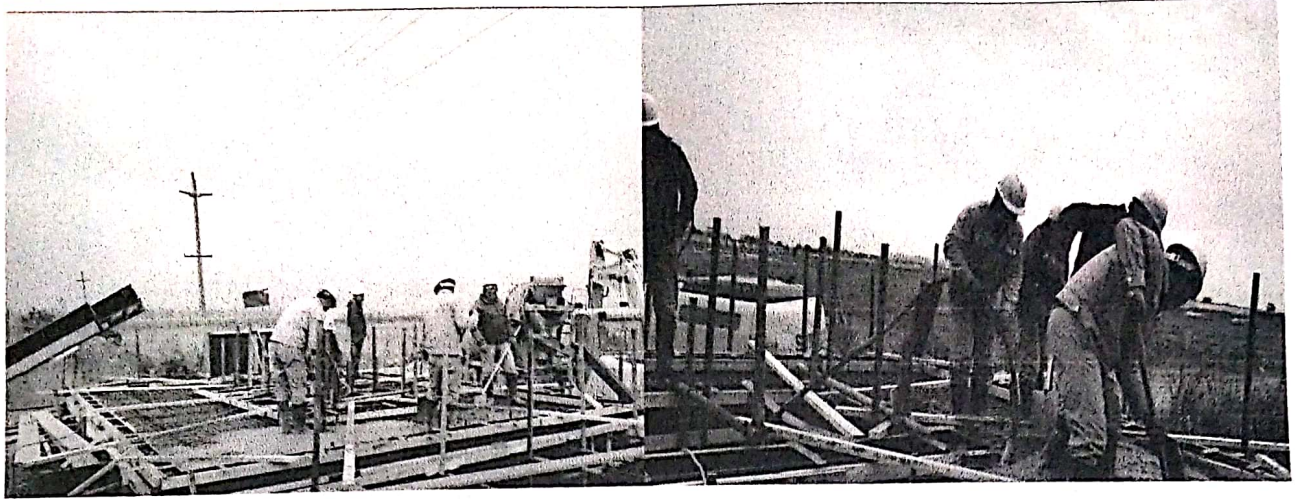

扫描全能王 创建
