


旁站记录表

工程名称: 崇礼区 28 个村级扶贫电站项目 (四标段大南营村)

编号: ZHJL-JLPZ-007

日期及气候: 2019 年 9 月 18 日 晴	施工地点: 四标段大南营村
旁站监理的部位或工序: 钻孔灌注桩灌注	
旁站监理开始时间: 8:23	旁站监理结束时间: 10:39
施工情况: 施工人员 10 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。  	
监理情况: 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好; 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求; 3、测量钻孔深度符合设计要求; 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作, 要求施工单位对浇筑桩基振捣; 5、现场已预留一组试块。	
发现问题: 无。	
处理意见: 无。	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: <u>天威新能源系统工程 (北京) 有限公司</u> 质 检 员: <u>全进喜</u> 日 期: <u>2019</u> 年 <u>09</u> 月 <u>18</u> 日	项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>赵向平</u> 日 期: <u>2019</u> 年 <u>09</u> 月 <u>18</u> 日

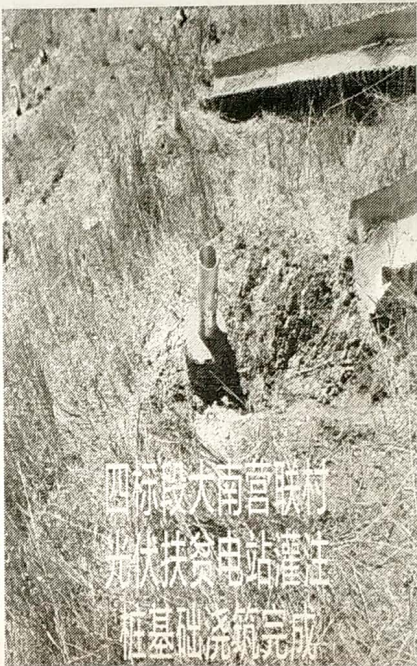

扫描全能王 创建
