

旁站记录表

工程名称: 崇礼区 9 个村级扶贫电站项目 (六标段场上村)

编号: ZHJL-JLPZ-003

日期及气候: 2019 年 9 月 19 日 阴转多云

施工地点: 六标段场上村


旁站监理的部位或工序: 钻孔灌注桩灌注

旁站监理开始时间: 9:30

旁站监理结束时间: 12:30

施工情况:

施工人员 15 人, 管理人员 3 人, 施工设备到场情况良好。

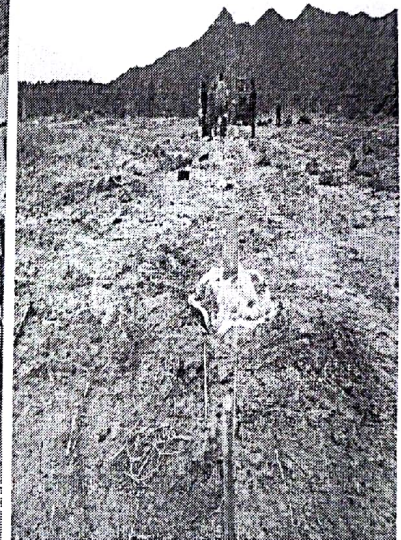

监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求。
- 3、测量钻孔深度符合设计要求,测量钢筋笼长宽及箍筋符合设计要求。
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作,要求施工单位对浇筑桩基振捣。

发现问题: 墩基础支模缺少易导致未支模前混凝土凝固

处理意见: 要求施工方增加墩基础模具

备注 (包括处理结果): 浇筑结束后,口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。

承包单位: 陕西众森工程有限责任公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 李强

旁站监理人员: 张良玉

日期: 2019年9月20日

日期: 2019年9月20日



由 扫描全能王 扫描创建
