

旁站记录表

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段下窑子村）

编号：ZHJL-JLPZ-004

日期及气候：2019 年 9 月 22 日 阴转多云

施工地点：六标段下窑子


旁站监理的部位或工序：钻孔灌注桩灌注

旁站监理开始时间：9:30

旁站监理结束时间：16:00

施工情况：

施工人员 9 人，管理人员 2 人，施工设备到场情况良好。

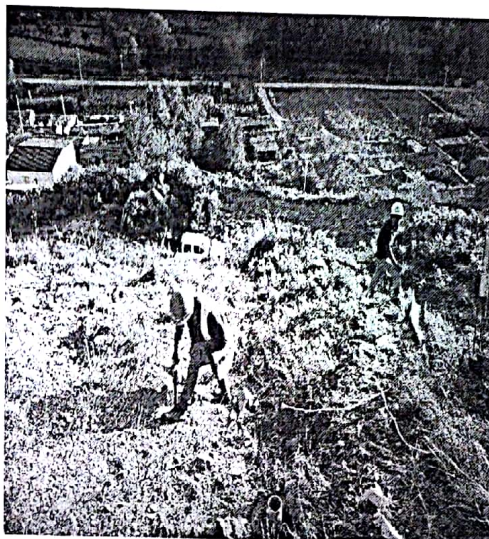

监理情况：

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、测量桩壁厚及桩长度符合设计要求。
- 3、测量钻孔深度符合设计要求，测量钢筋笼长宽及箍筋符合设计要求。
- 4、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作，要求施工单位对浇筑桩基振捣。

发现问题：振捣发电机汽油缺失导致振捣机不能用

处理意见：要求施工方向发电机上油保持振捣到位

备注（包括处理结果）：浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。

承包单位：陕西众森工程有限责任公司

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员：李强

旁站监理人员：张良奎

日期：2019 年 9 月 22 日

日期：2019 年 9 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建
