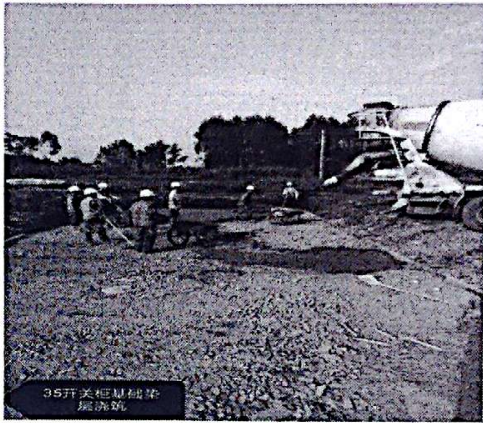


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—02

日期及气候：2019 年 10 月 21 日 晴 23-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：设备基 35KV 开关柜（一次舱）垫层浇筑	
旁站监理开始时间：08：30	旁站监理结束时间：10：30
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，挖机 1 台、平板振动泵 1，推车 3 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15，20m³。  二次舱基础垫层浇筑完成  35开关柜基础垫层浇筑	
监理情况： 监理对垫层浇筑进行旁站。	
处理意见： 现场未出现异常情况。	
备注：	
项目部：湛江聚能 质检员：卡启华 2019 年 10 月 22 日	项目监理部：湛江聚能 旁站监理人员：严卫忠 2019 年 10 月 21 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
