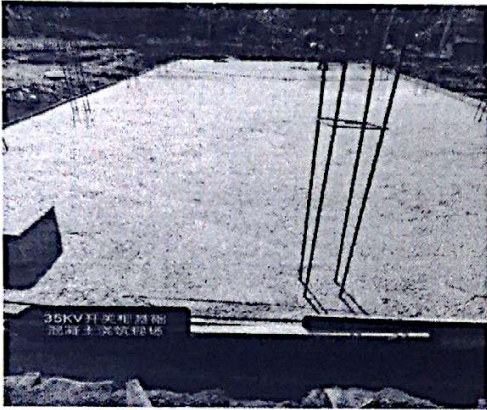
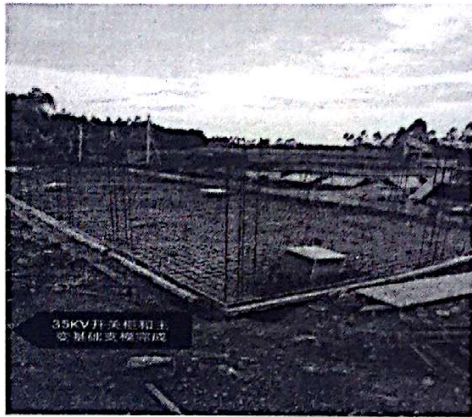


## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目  
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019 年 10 月 26 日 晴 23-29℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队                                                                                                 |
| 旁站监理的部位或工序：设备基础 35KV 开关柜（一次舱）基础底板浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 旁站监理开始时间：13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：15:30                                                                                                          |
| <p>施工情况：</p> <p>1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 1，推车 3 辆。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土等级为 C35，20m³。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;">   </div> |                                                                                                                         |
| <p>监理情况：</p> <p>要求浇筑过程中使用振捣棒，以免拆模出现蜂窝麻面。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| <p>处理意见：</p> <p>已落实到位，无异常情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| <p>备注：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| <p>项目部： <u>湛江聚能</u></p> <p>质检员： <u>卡启华</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2019 年 10 月 27 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>项目监理部： <u>湛江聚能</u></p> <p>旁站监理人员： <u>王洪</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2019 年 10 月 26 日</p> |

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
