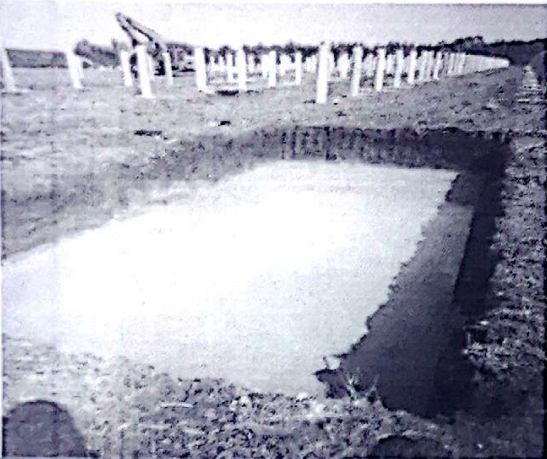


## 旁站监理记录表

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLPZ-09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2019 年 10 月 27 日 晴 23-28℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队                                                                              |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏区 1#箱逆变一体基础垫层浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| 旁站监理开始时间: 13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间: 16:30                                                                                       |
| <p>施工情况:</p> <p>1、浇筑施工人员 7 人, 振动泵 1 台, 混凝土搅拌机 1 台。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土等级为 C15, 10m³。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                                                                                                       |
| <p>监理情况:</p> <p>监理对垫层浇筑进行旁站。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <p>处理意见:</p> <p>未出现异常情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| <p>项目部: <u>雷州英利</u></p> <p>质检员: <u>李启华</u></p> <p style="text-align: right;">2019 年 10 月 28 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>项目监理部: <u>雷州英利</u></p> <p>旁站监理人员: <u>王兴</u></p> <p style="text-align: right;">2019 年 10 月 27 日</p> |

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份
