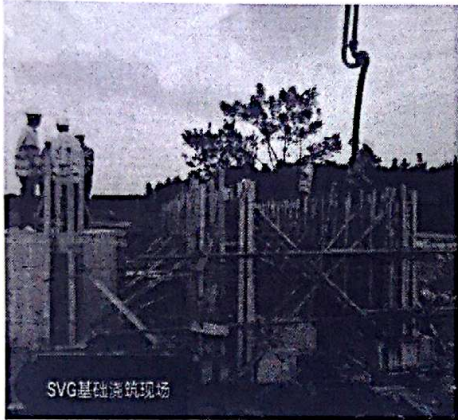
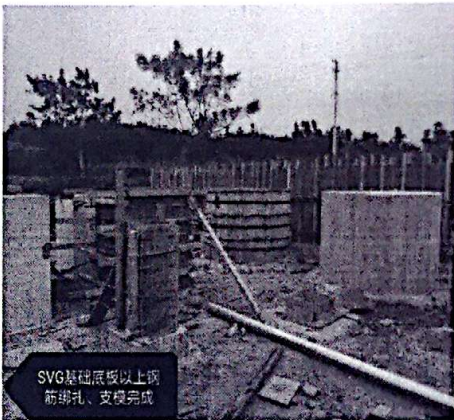


旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF—JLPZ—13

日期及气候: 2019 年 10 月 27 日 晴 23-29℃	工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序: 设备基础 SVG 构架浇筑	
旁站监理开始时间: 11: 30	旁站监理结束时间: 13:30
施工情况: 1、浇筑施工人员 8 人, 泵车 1 台、平板振动泵 1, 推车 3 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 20m³。  SVG基础浇筑现场  SVG基础底板以上钢筋绑扎、支模完成	
监理情况: 监理旁站时发现钢筋与模板间隙较小, 要求浇筑要求浇筑前调整, 确保钢筋与模板间的保护层。	
处理意见: 现场已整改完成, 符合要求。	
备注:	
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>卡启华</u> 2019 年 10 月 28 日	项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>严卫忠</u> 2019 年 10 月 28 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份
