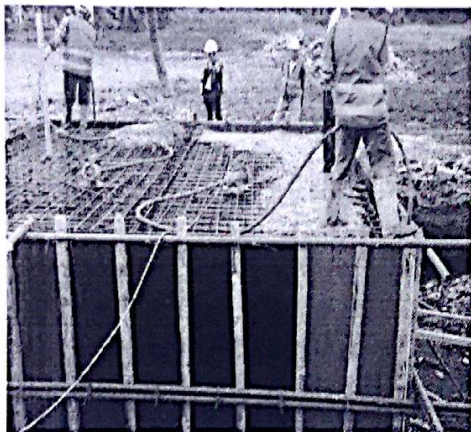
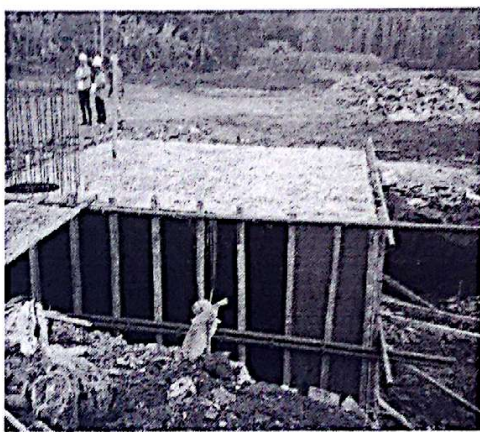


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—16

日期及气候：2019 年 11 月 02 日 晴 22-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：事故油池基础浇筑	
旁站监理开始时间：11:30	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 3 个，推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，36m³。  	
监理情况： 监理对主变基础浇筑进行旁站，要求使用振动泵，避免拆模后出现蜂窝麻面现象。	
处理意见： 现场已落实到位，未发生异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>卡启华</u> 2019 年 10 月 3 日	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>平卫忠</u> 2019 年 10 月 2 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
