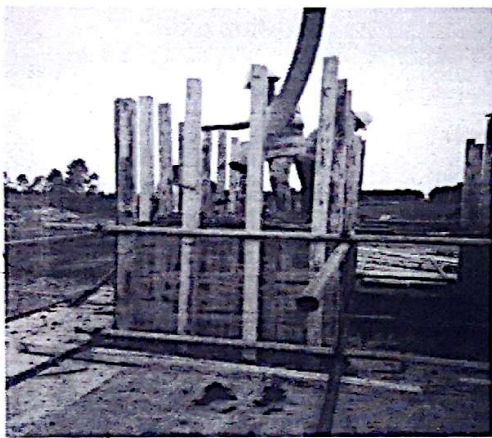


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—17

日期及气候：2019 年 11 月 02 日 晴 22-29℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：主变压器基础浇筑			
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 3 个，推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，36m³。  			
监理情况： 监理对主变基础浇筑进行旁站，要求施工单位对基础垫层浇筑时用平板振动泵，以免拆模出现麻面			
处理意见： 现场已落实到位，未发生异常情况。			
备注：			
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>卡启华</u> 2019 年 11 月 3 日		项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>平卫忠</u> 2019 年 11 月 2 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
