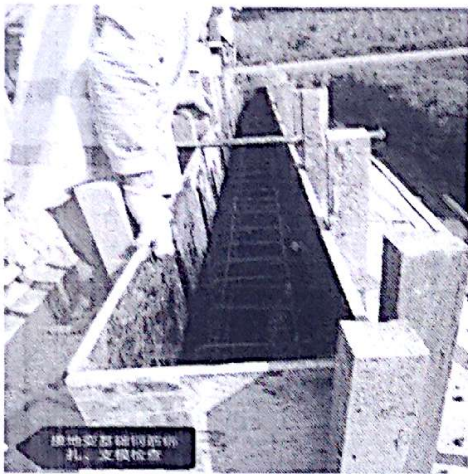


## 旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目  
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—23

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019 年 11 月 22 日 晴 15-28℃                                                                                                    | 工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队                                                                                                        |
| 旁站监理的部位或工序：升压站接地变基础浇筑                                                                                                              |                                                                                                                                |
| 旁站监理开始时间：14:10                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：15:20                                                                                                                 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、浇筑施工人员 4 人，铁锹 2 把，振动泵 1 个。</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。</p> <p>3、混凝土等级为 C35，12m³。</p>                       |                                                                                                                                |
|  <p style="font-size: small;">接地变基础钢筋绑扎、支模检查</p> |  <p style="font-size: small;">接地变基础浇筑现场</p> |
| <p>监理情况：</p> <p>监理旁站时，要求现场施工人员浇筑时使用振动泵。</p>                                                                                        |                                                                                                                                |
| <p>处理意见：</p> <p>现场已落实到位，未发现异常情况。</p>                                                                                               |                                                                                                                                |
| 备注：                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| <p>项目部： <u>湛江聚能</u></p> <p>质检员： <u>李启华</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2019 年 11 月 23 日</p>                | <p>项目监理部： <u>湛江聚能</u></p> <p>旁站监理人员： <u>李卫忠</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2019 年 11 月 22 日</p>       |

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
