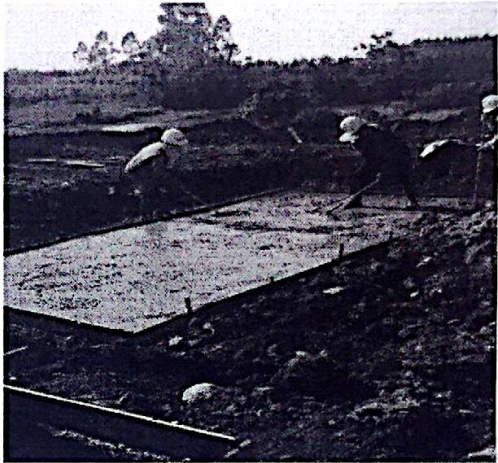


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号： LZGF—JLPZ—25

日期及气候：2019 年 11 月 08 日 晴 22-29℃	工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队
旁站监理的部位或工序：GIS 底板垫层浇筑	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 3 个，推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C15，36m³。  	
监理情况： 监理对垫层浇筑进行旁站。	
处理意见： 未发现异常情况。	
备注：	
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>卡启华</u>	项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>严卫忠</u>
2019 年 11 月 9 日	2019 年 11 月 8 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
