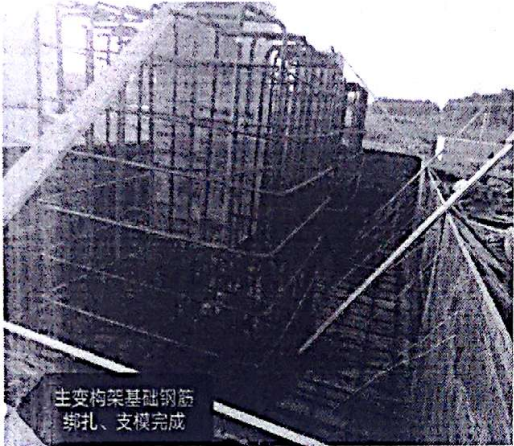


旁站监理记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZGF—JLPZ—26

日期及气候：2019 年 11 月 08 日 晴 22-29℃		工程地点：广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序：主变出线构架基础浇筑			
旁站监理开始时间：16:30		旁站监理结束时间：18:30	
施工情况： 1、浇筑施工人员 8 人，平板振动泵 3 个，推车 1 辆。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35，36m³。			
 主变构架基础钢筋 绑扎、支模完成		 主变出线构架基础 浇筑	
监理情况： 监理旁站时要求浇筑过程中使用振捣棒，以免拆模出现蜂窝麻面。			
处理意见： 现场已落实到位，未发生异常情况。			
备注：			
项目部： <u>湛江聚能</u> 质检员： <u>李启华</u> 2019 年 11 月 9 日		项目监理部： <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员： <u>李卫忠</u> 2019 年 11 月 8 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 四 份
